

【東日本大震災津波】社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

策定の趣旨

◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、身近な社会資本の整備に関する情報を定期的に提供

被災者や被災地の事業者が、今後の生活再建・事業再開等を具体的に検討するためには、県民生活に身近な社会資本の復旧・復興の工程についての情報が不可欠です。

また、本格復興の着実な推進を、目に見える形で広く情報発信する必要があります。このため、県では、現時点における県民生活に身近な社会資本（主要8分野）の復旧・復興事業の動きや今後の見通しについて情報提供を行うものです。

なお、記載している工程等については、様々な要因により変更等が必要になる可能性があることから、定期的に最新のデータに更新していきます。

ロードマップの構成

◆ 主要8分野について掲載

- ① 海岸保全施設
- ② 復興まちづくり
- ③ 復興道路等
- ④ 災害公営住宅
- ⑤ 漁港
- ⑥ 港湾
- ⑦ 医療（病院、医科診療所）
- ⑧ 教育（小学校、中学校、高等学校）

◆ 総括と市町村別の2種類で構成

- 1 総括表
 - ① 復旧・復興事業の動き
 - ② 分野別の着工・完成箇所割合
 - ③ 事業計画掲載箇所一覧
 - ④ 復旧・復興ロードマップの見方
- 2 市町村別工程表
 - ① 各事業箇所の位置図
 - ② 年度別の整備スケジュール

ロードマップの更新

◆ 更新頻度

事業計画の策定や許認可に関する手続き、復旧・復興事業に係る工事が具体的に進捗してきていることから、その進捗状況を分かりやすくお知らせするため、四半期ごとに基準日を定め、定期的に最新のデータに更新していきます。

◆ 工程の主要な変更要因

- ① 自治体の職員の不足
 - ② 労働者と建設資材不足
 - ③ 用地取得期間の長期化
- 公表している工程を達成するためには、上記課題の解決が必要です。

◆ 情報発信


社会資本の復旧・復興ロードマップは、これまでに策定したものを併せ、県のホームページで公表しています。

(<http://www.pref.iwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html>)

復旧・復興事業の動き


◆ 前回の公表時点（基準日：平成25年12月31日）から、今回の更新までの期間の復興事業の進捗状況を『工事の着工と完成』に着目し整理しています。全箇所数：725箇所

◆ 着工箇所数

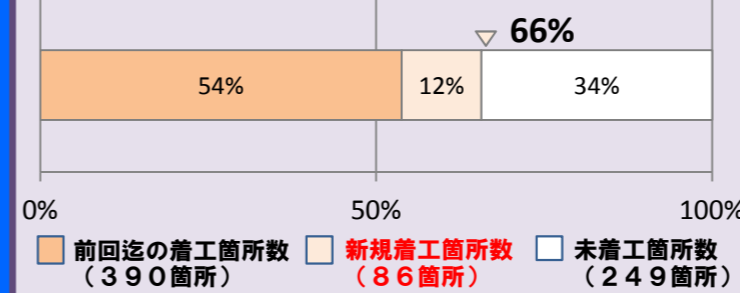

※ 着工：12%増加し、全箇所の66%


◆ 完成箇所数

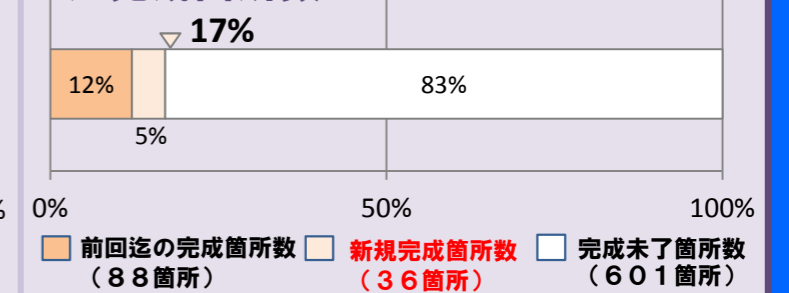

※ 完成：5%増加し、全箇所の17%

分野別の着工・完成箇所割合

◆ 社会資本の主要8分野における分野別の着工箇所と完成箇所の割合を整理しています。

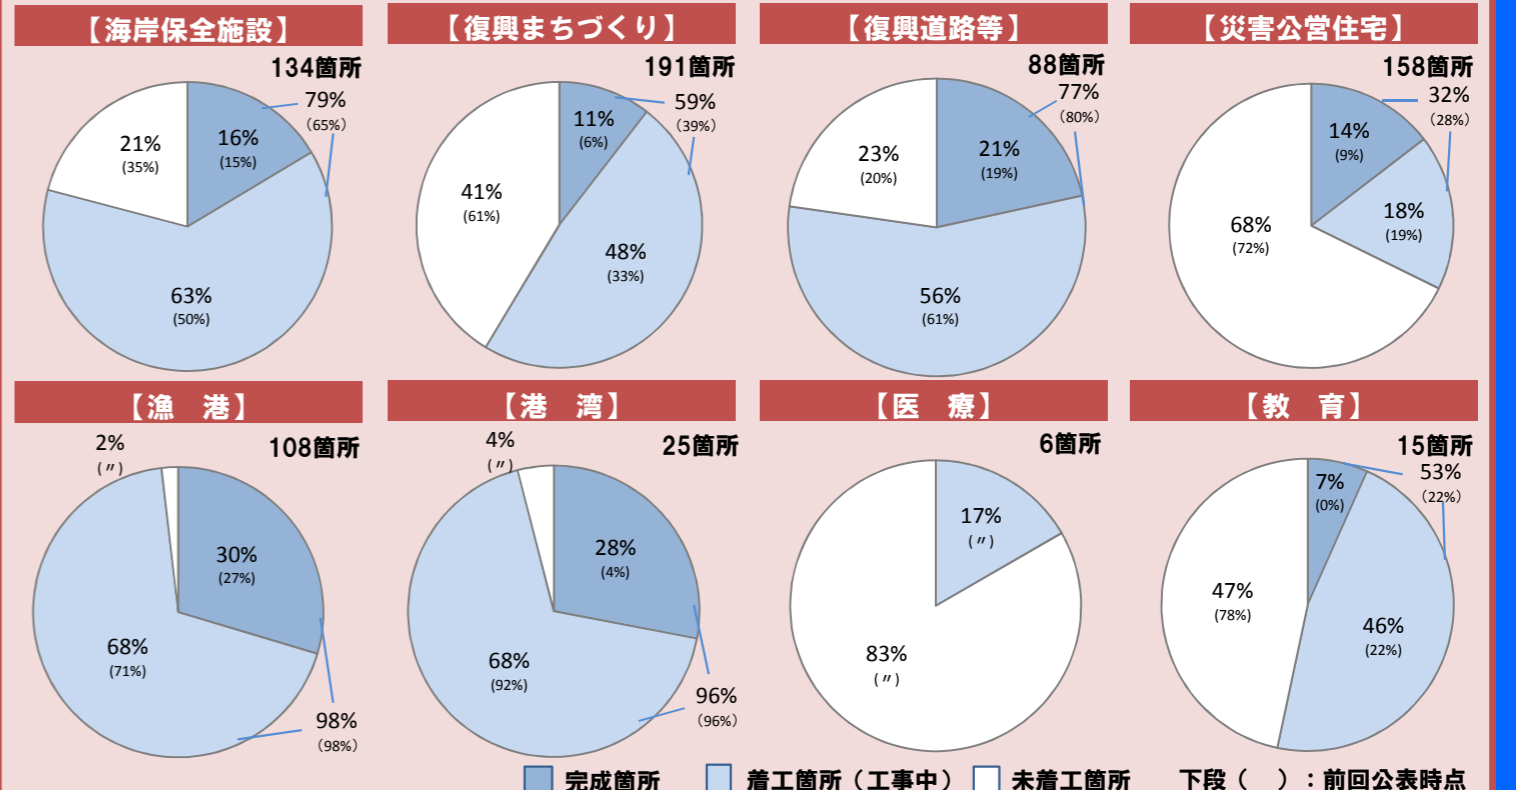

【お問い合わせ】岩手県復興局まちづくり再生課（019-629-6935）

【東日本大震災津波】 社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

住宅再建のトピックス

宅地供給区画数 8,291区画（8,513区画から222区画の減少）
災害公営住宅戸数 5,969戸（6,038戸から69戸の減少）

市町村別 事業計画掲載箇所一覧

※ 赤字は前回からの変更箇所

市町村名	事業主体	海岸保全施設				復興まちづくり											復興道路等						災害公営住宅		漁港	港湾	医療	教育
		一般海岸 港湾海岸	農地海岸 林野海岸	漁港海岸	計	土地区画整理		防災集団移転		漁業集落防災		津波復興 拠点	面整備計		街路整備	まちづくり 連携道路	復興道路		復興支援道路		復興関連道路		箇所数	戸数	漁港数	地区数	箇所数	箇所数
		河川・海岸数	海岸数	海岸数	河川・海岸数	地区数	区画数	団地数	区画数	地区数	区画数	地区数	地区数	区画数	路線数	箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	箇所数	戸数	漁港数	地区数	箇所数	箇所数
洋野町	県	6	0	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	0	0	1	2	-	-	
	町	-	-	0	0	0	0	0	0	1	17	0	1	17	-		(国)1	-	-	-	-	1	4	8	-	-	-	
	計	6	0	1	7	0	0	0	0	1	17	0	1	17	-		1	1	0	0	1	1	1	4	9	2	-	-
久慈市	県	5	0	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	1	1	2	2	0	0	1	4	-	-	
	市	-	-	2	2	0	0	0	0	4	15	0	4	15	-		(国)2	-	-	-	-	3	11	9	(国)1	-	-	
	計	5	0	3	8	0	0	0	0	4	15	0	4	15	-		2	1	1	2	2	3	11	10	5	-	-	
野田村	県	6	2	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	2	2	26	1	-	-	-	
	村	-	-	0	0	1	124	2	39	2	15	0	5	178	-		(国)1	-	-	-	-	5	75	2	-	-	-	
	計	6	2	0	8	1	124	2	39	2	15	0	5	178	-		1	0	0	1	2	7	101	3	-	-	-	
普代村	県	4	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	0	0	0	0	0	0	2	-	-		
	村	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	-		(国)3	-	-	-	-	0	0	3	-	-	-	
	計	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	-		3	0	0	0	0	0	0	5	-	-	-	
田野畑村	県	2	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	3	0	0	1	-	-		
	村	-	-	1	1	0	0	0	0	2	53	0	2	53	-		(国)3	-	-	-	-	5	63	3	-	-	-	
	計	2	0	2	4	0	0	0	0	2	53	0	2	53	-		3	0	0	1	3	5	63	4	-	-	-	
岩泉町	県	2	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	2	3	0	0	0	0	1	1	-	-	
	町	-	-	1	1	0	0	0	0	1	60	0	1	60	-		(国)1	-	-	-	-	2	51	1	-	1	2	
	計	2	0	2	4	0	0	0	0	1	60	0	1	60	-		1	2	3	0	0	2	51	2	1	1	2	
宮古市	県	13	2	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	三陸沿岸道 路、宮古盛 岡横断道路	1	1	3	3	3	12	363	3	7	-	-	
	市	-	-	3	3	3	410	5	324	9	31	2	19	765	-		(国)7	-	-	-	-	15	430	15	(国)1	1	0	
	計	13	2	4	19	3	410	5	324	9	31	2	19	765	-		8	1	3	3	3	27	793	18	8	1	0	
山田町	県	4	3	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	三陸沿岸 道路	-	1	1	0	0	11	556	4	-	1	-	
	町	-	-	1	1	4	322	4	461	2	152	1	11	935	-		(国)2	-	-	-	-	8	275	2	-	-	1	
	計	4	3	5	12	4	322	4	461	2	152	1	11	935	0		1	2	1	1	0	0	19	831	6	-	1	1
大槌町	県	2	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	5	500	2	-	1	-	
	町	-	-	0	0	4	1,168	17	723	4	12	2	27	1,903	-		(国)1	-	-	-	-	20	480	0	-	-	2	
	計	2	1	2	5	4	1,168	17	723	4	12	2	27	1,903	0		1	1	0	0	1	1	25	980	2	-	1	2
釜石市	県	6	3	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	三陸沿岸道 路、東北横 断自動車道 釜石秋田線	-	1	1	3	3	4	210	6	1	-	-	
	市	-	-	7	7	4	1,243	11	141	14	91	2	31	1,475	-		(国)3	-	-	-	-	27	1,135	9	(国)1	-	4	
	計	6	3	12	21	4	1,243	11	141	14	91	2	31	1,475	0		5	3	1	1	3	3	31	1,345	15	2	-	4
大船渡市	県	7	3	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	9	507	6	6	-	-	
	市	-	-	8	8	1	250	23	388	1	30	1	26	668	-		(国)2	-	-	-	-	17	283	16	(国)1	-	3	
	計	7	3	13	23	1	250	23	388	1	30	1	26	668	1		5	2	0	0	1	1	26	790	22	7	-	3
陸前高田市	県	8	2	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	三陸沿岸 道路	-	0	0	2	2	6	700	3	-	1	1	
	市	-	-	6	6	2	1,725	26	497	0	0	2	30	2,222	-		(国)2	-	-	-	-	6	300	9	-	1	2	
	計	8	2	9	19	2	1,725	26	497	0	0	2	30	2,222	0		7	2	0	0	2	2	12	1,000	12	-	2	3
全体	県	65	16	24	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	3路線	1	6	9	15	18	49	2,862	31	21	3	1	
	市町村	0	0	29	29	19	5,242	88	2,573	41	476	10	158	8,291	0		0	(国)28	-	-	-	-	109	3,107	77	(国)4	3	14
	計	65	16	53	134	19	5,242	88	2,573	41	476	10	158	8,291	1		32	35※	6	35※	15	18	158	5,969	108	25	6	15

※ 復興道路等の全体の箇所数には、その他の市町村の箇所数を含んでいます。

【東日本大震災津波】社会資本の復旧・復興ロードマップ


基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

分野別 整備スケジュール

※ 全ての箇所を網羅して記載




(参考) 市町村別工程表の見方(宮古市の例から抜粋表示)

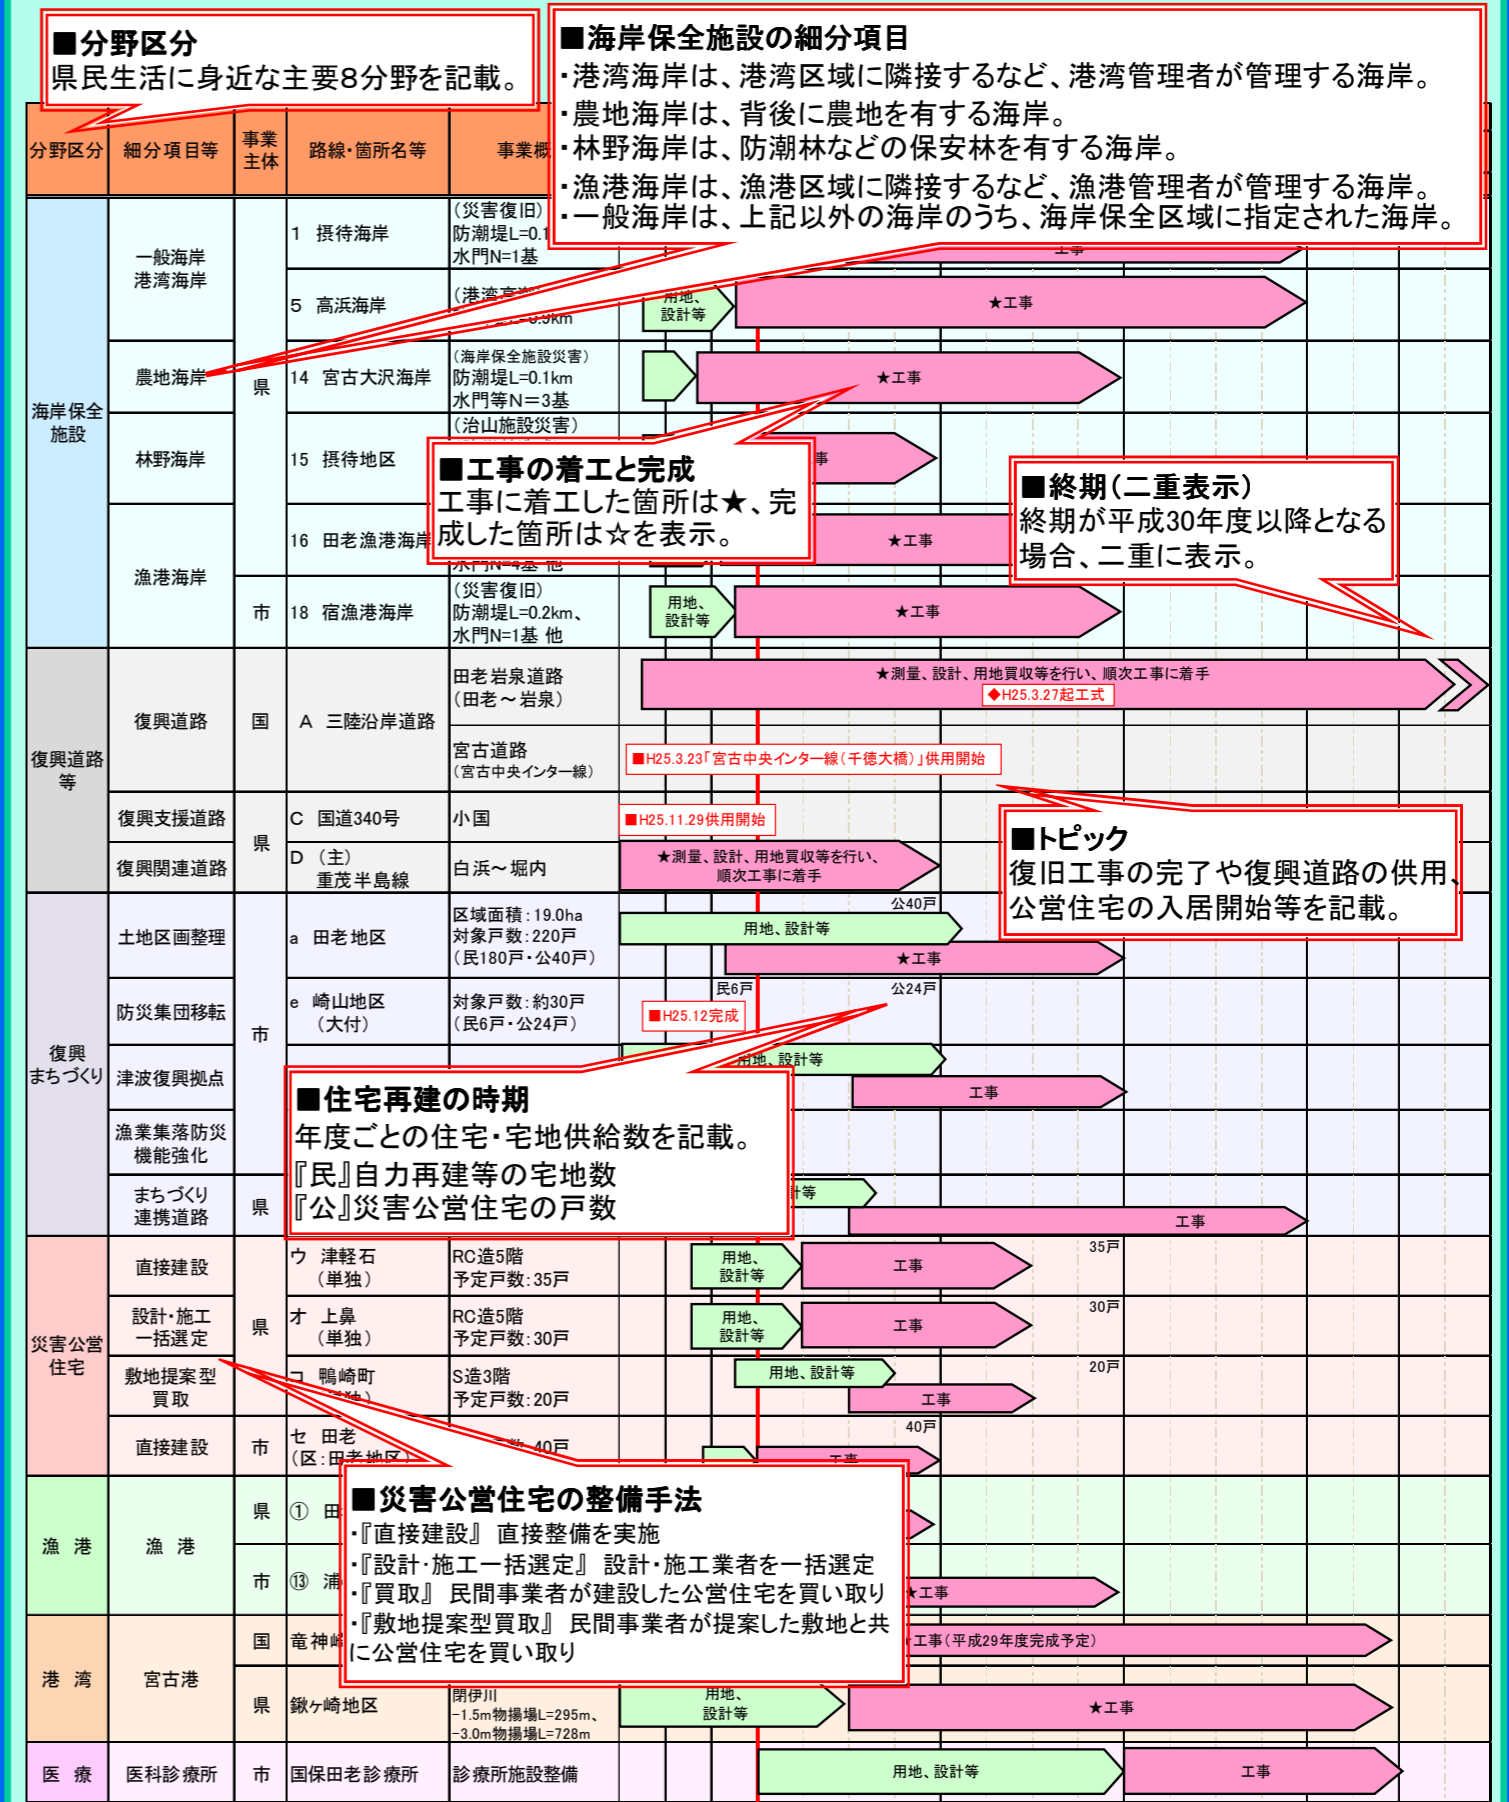

社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市1/2】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

新たな視点による 新たなまちづくり

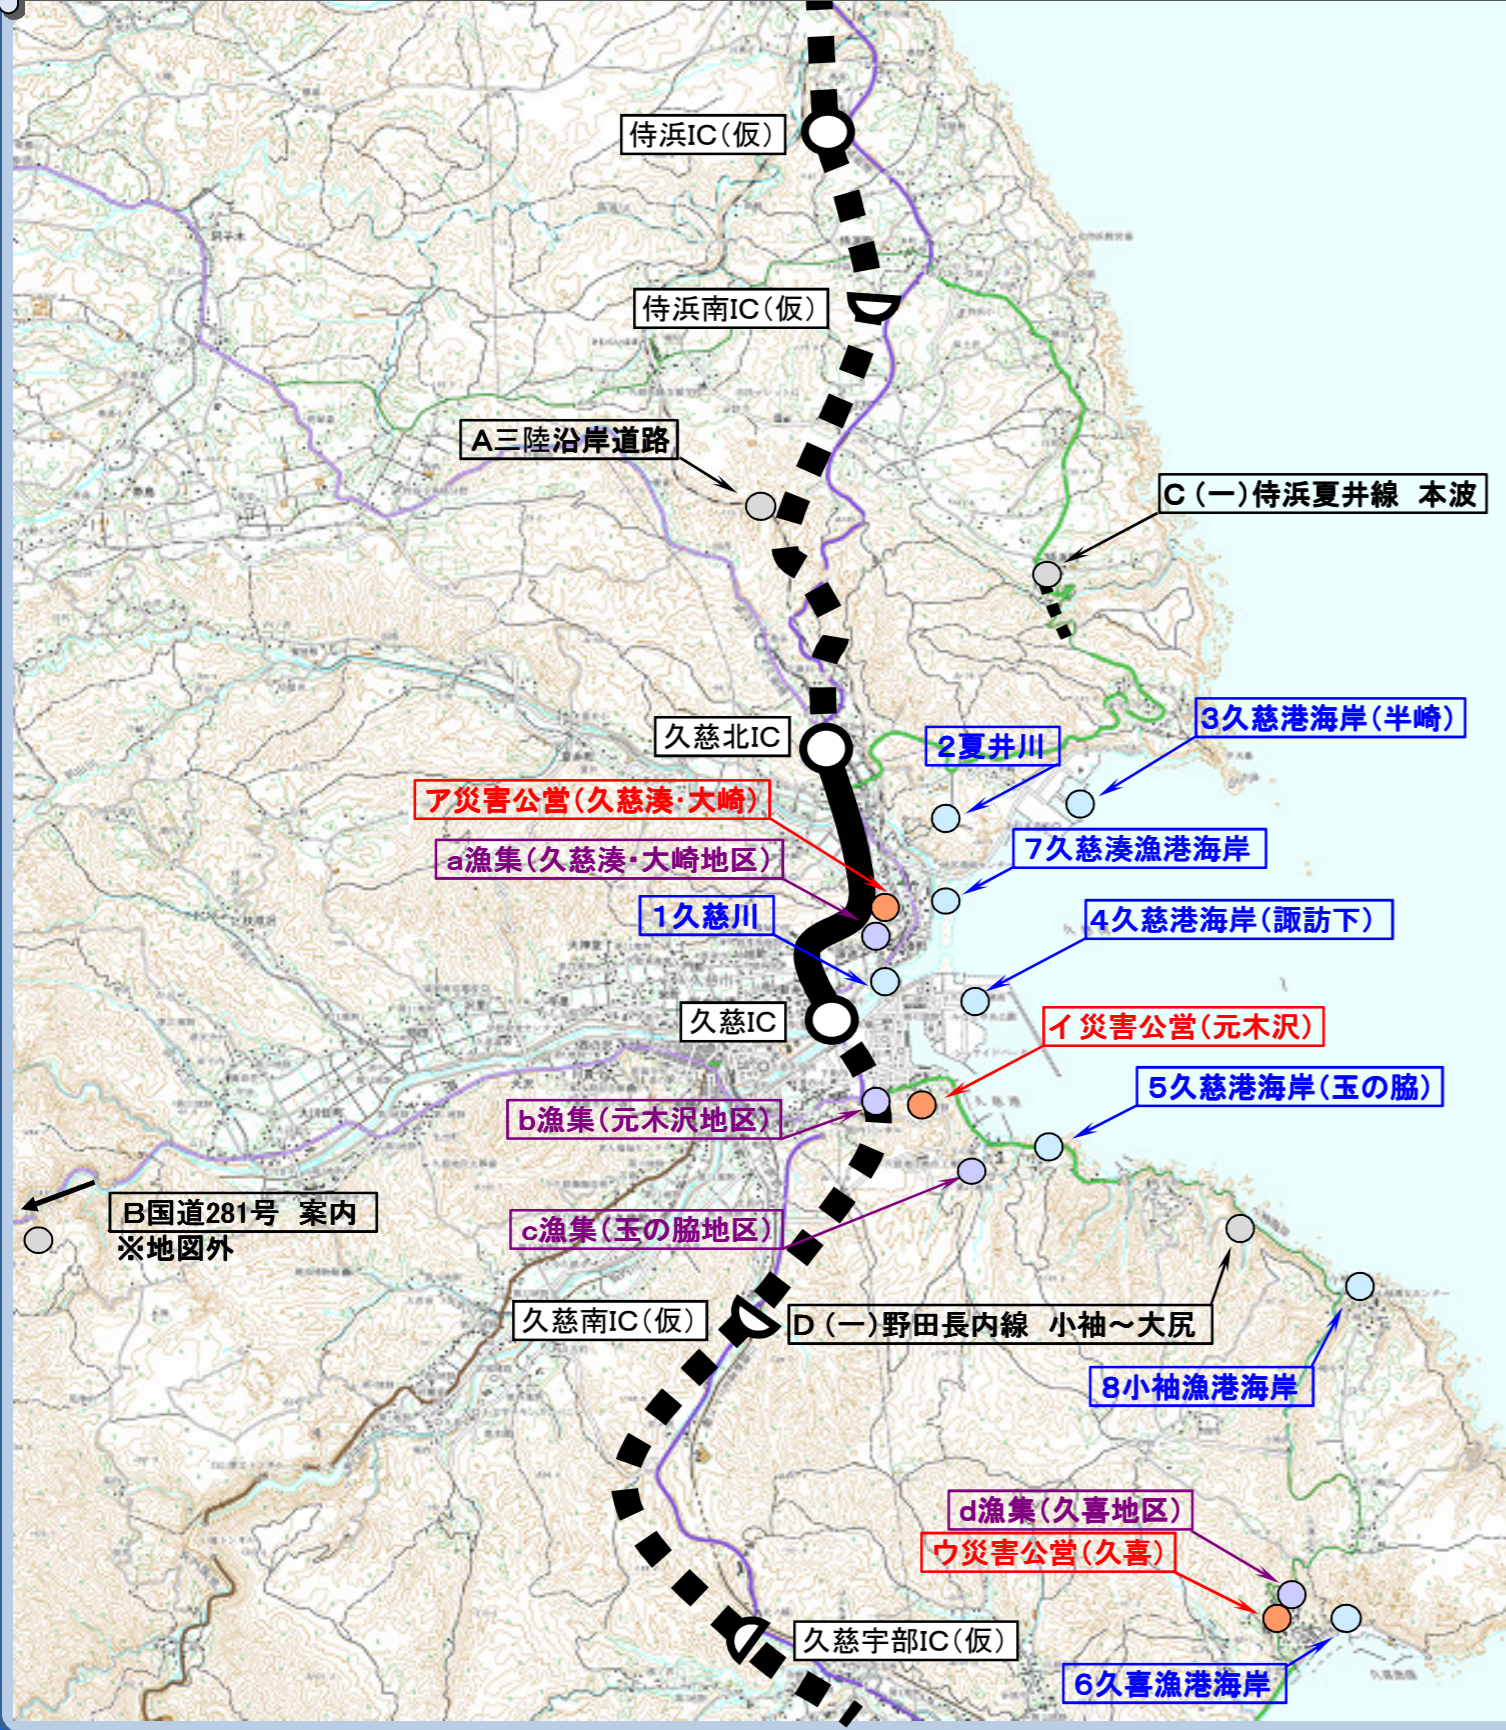


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基準復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる風開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	用地、設計等				★工事				
			2 夏井川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.8km	用地、設計等				★工事				
	港湾海岸	市	3 久慈港海岸(半崎)	(災害復旧) 離岸堤L=0.2km	■H24.10完成								
			4 久慈港海岸(諏訪下)	(災害復旧) 防潮堤L=2.6km、陸間N=12基	用地、設計等				★工事				
	漁港海岸	市	5 久慈港海岸(玉の脇)	(災害復旧) 離岸堤L=0.4km	■H24.10完成								
			6 久喜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	用地、設計等				★工事				
			7 久慈湊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=4基	用地、設計等				★工事				
			8 小袖漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	用地、設計等				★工事				
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	久慈北道路					★用地・工事の推進				
			野田久慈道路(普代～久慈)					★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.27起工式					
	復興関連道路	県	B 国道281号	案内					★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.12着工				
			C (-) 侍浜夏井線	本波					■H24.9.30供用開始				
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	a 久慈湊・大崎	集落道、避難施設、用地造成 他 対象戸数：14戸 (民9戸・公5戸)	用地、設計等				★工事(用地造成はH25完了)				
			b 元木沢	集落道、避難施設、用地造成 他 対象戸数：5戸 (民2戸・公3戸)					■H25.11完成				
			c 玉の脇	集落道、用地造成 他 対象戸数：3戸 (民3戸)					■H25.11完成				
			d 久喜	集落道、漁業集落排水、用地造成 他 対象戸数：4戸 (民1戸・公3戸)					■H25.8完成				
災害公営住宅	直接建設	市	ア 久慈湊・大崎(漁：久慈湊・大崎地区)	木造 予定戸数：5戸					■H26.3完成				
			イ 元木沢(漁：元木沢地区)	木造 予定戸数：3戸					■H26.3完成				
			ウ 久喜(漁：久喜地区)	木造 予定戸数：3戸					■H25.12完成				

社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

安全・安心で活力あるむらづくり

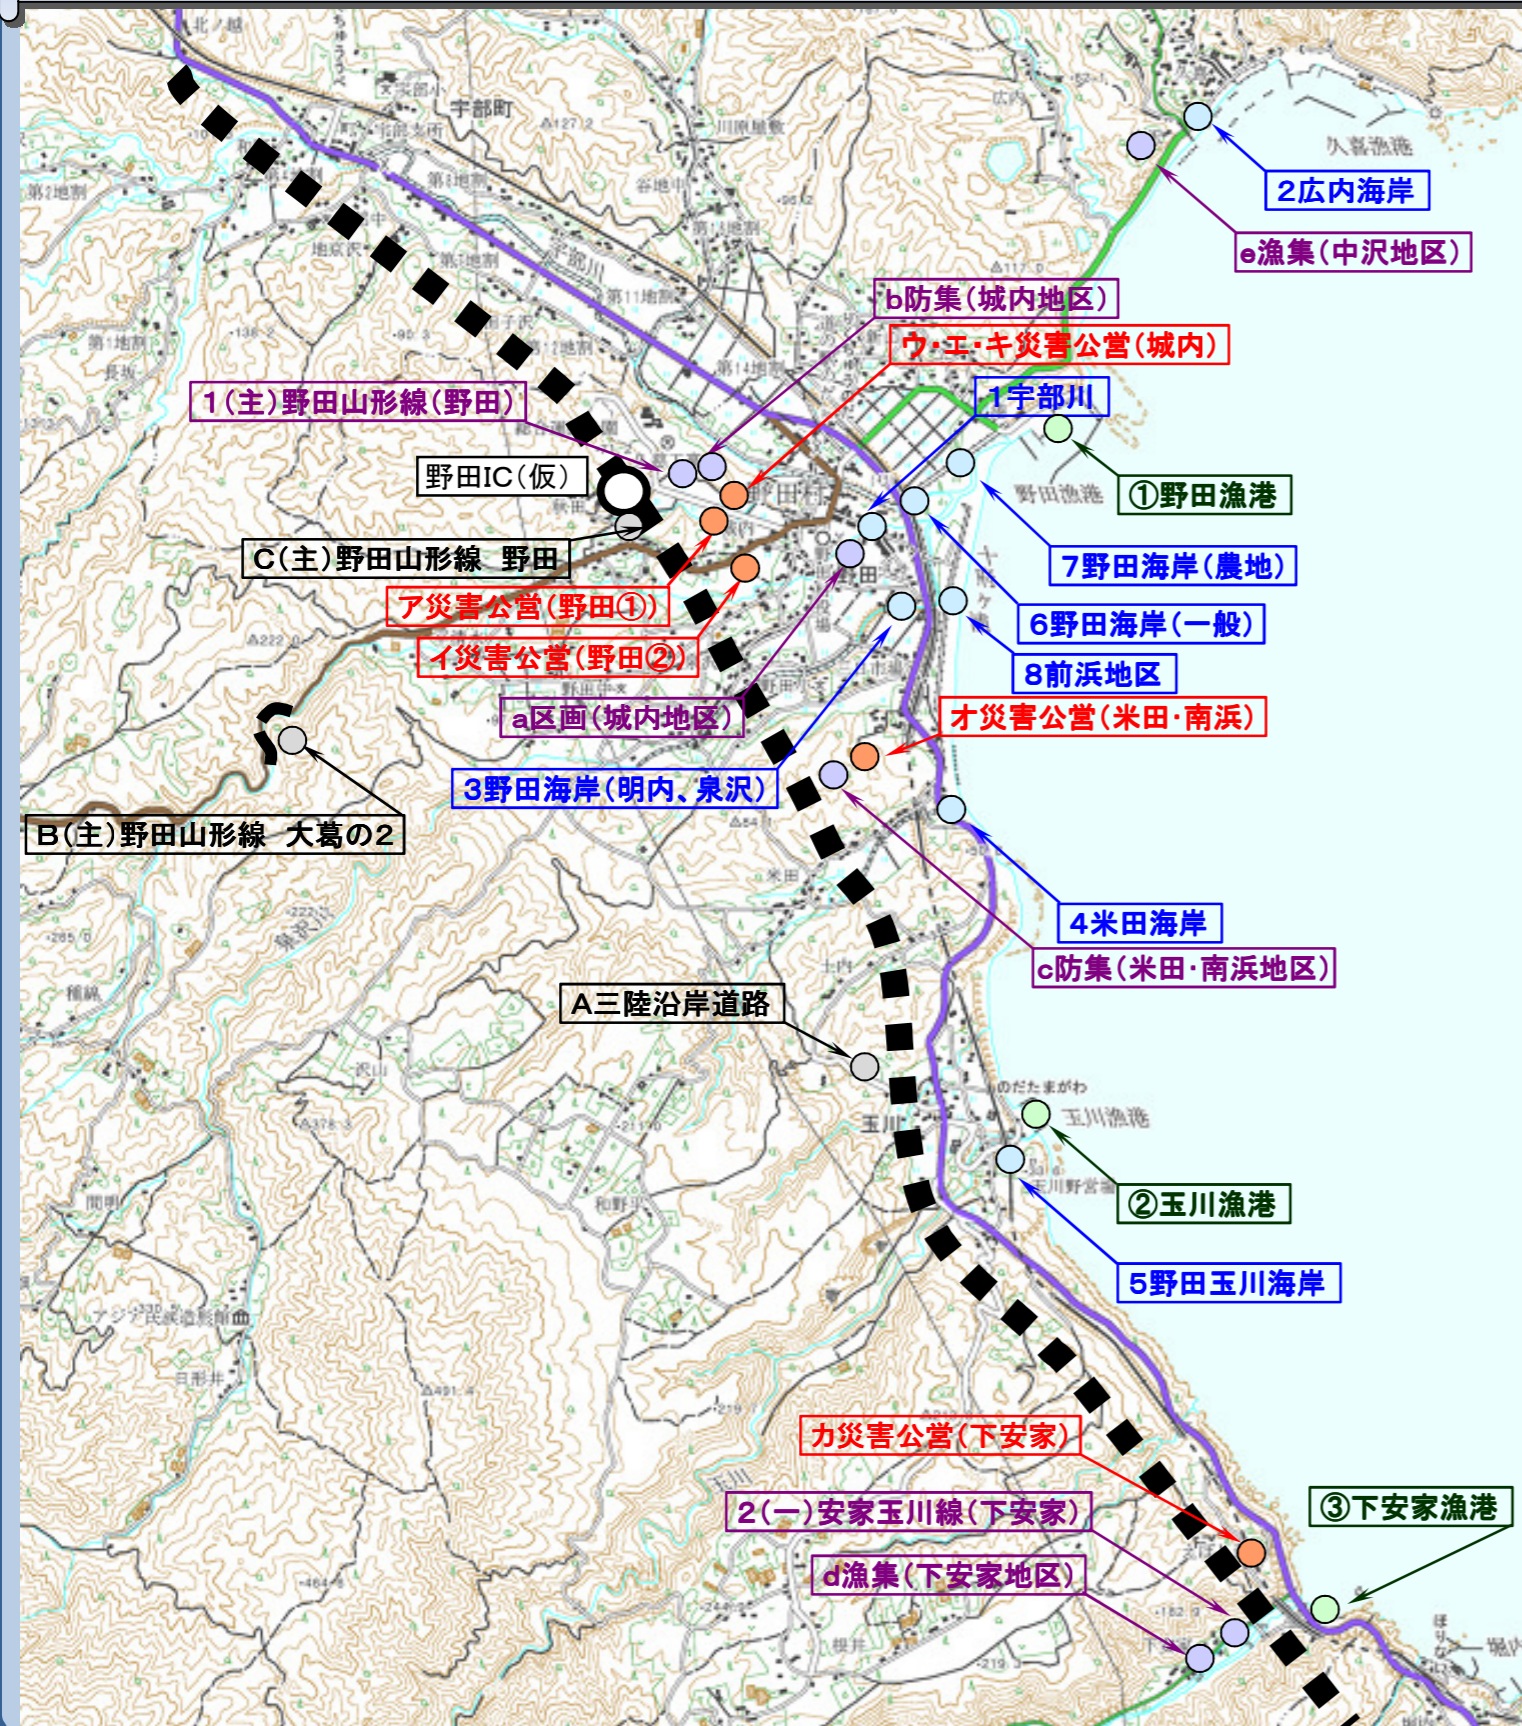


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸安全施設	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧) 水門設備1式他	■H26.3完成									
			2 広内海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門等N=4基他	用地、設計等		★工事							
			3 野田海岸(明内、泉沢)	(災害復旧) 水門設備等1式他	■H25.3完成									
			4 米田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門等N=2基他	用地、設計等		★工事							
			5 野田玉川海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.05km他	■H25.5完成									
			6 野田海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km、水門等N=1基	用地、設計等		★工事							
			7 野田海岸(農地)	(海岸保全施設災害) 防潮堤裏面A=2,320m ² 、水門操作室N=1棟	■H24.8完成									
			8 前浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km	用地、設計等		★工事							
復興道路等	復興関連道路	国	A 三陸沿岸道路	野田久慈道路(菅代〜久慈)				★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
			B(主) 野田山形線	大葛の2	■H25.7.2供用開始									
			C(主) 野田山形線	野田			測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
復興まちづくり	土地区画整理	村	a 城内地区	区域面積: 12.9ha 対象戸数: 135戸 (民124戸・公11戸)	用地、設計等									
			b 城内地区	対象戸数: 76戸 (民21戸・公55戸)	用地、設計等									
	防災集団移転	村	c 米田・南浜地区	対象戸数: 24戸 (民18戸・公6戸)	■H25.11完成									
			d 下安家地区	集落道、用地造成他 対象戸数: 14戸 (民13戸・公1戸)	用地、設計等									
			e 中沢地区	用地造成他 対象戸数: 2戸 (民2戸)	用地、設計等									
	まちづくり連携道路	県	1(主)野田山形線	野田				★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
2(一)安家玉川線			下安家				★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
災害公営住宅	直接建設	県	ア 野田①(単独)	木造2階 予定戸数: 8戸	■H25.3完成									
			イ 野田②(単独)	木造平屋 予定戸数: 18戸	■H26.1完成									
			ウ 城内(区: 城内地区)	木造 予定戸数: 11戸	用地、設計等							11戸		
			エ 城内(防: 城内地区)	木造 予定戸数: 55戸	用地、設計等							55戸		
			オ 米田・南浜(防: 米田・南浜地区)	木造 予定戸数: 6戸	★工事							6戸		
			カ 下安家(漁: 下安家地区)	木造 予定戸数: 1戸	★工事							1戸		
			キ 城内(単独)	木造 予定戸数: 2戸	用地、設計等							2戸		
漁港	漁港	村	① 野田漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、崖壁L=307m 他	■H26.3完成									
			② 玉川漁港	(漁港災害) 防波堤L=132m、崖壁L=50m 他	■H24.9完成									
			③ 下安家漁港	(漁港災害) 防波堤L=28m 他	■H24.9完成									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【普代村】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

あすへの一步 青い海（水産業）の復興へ

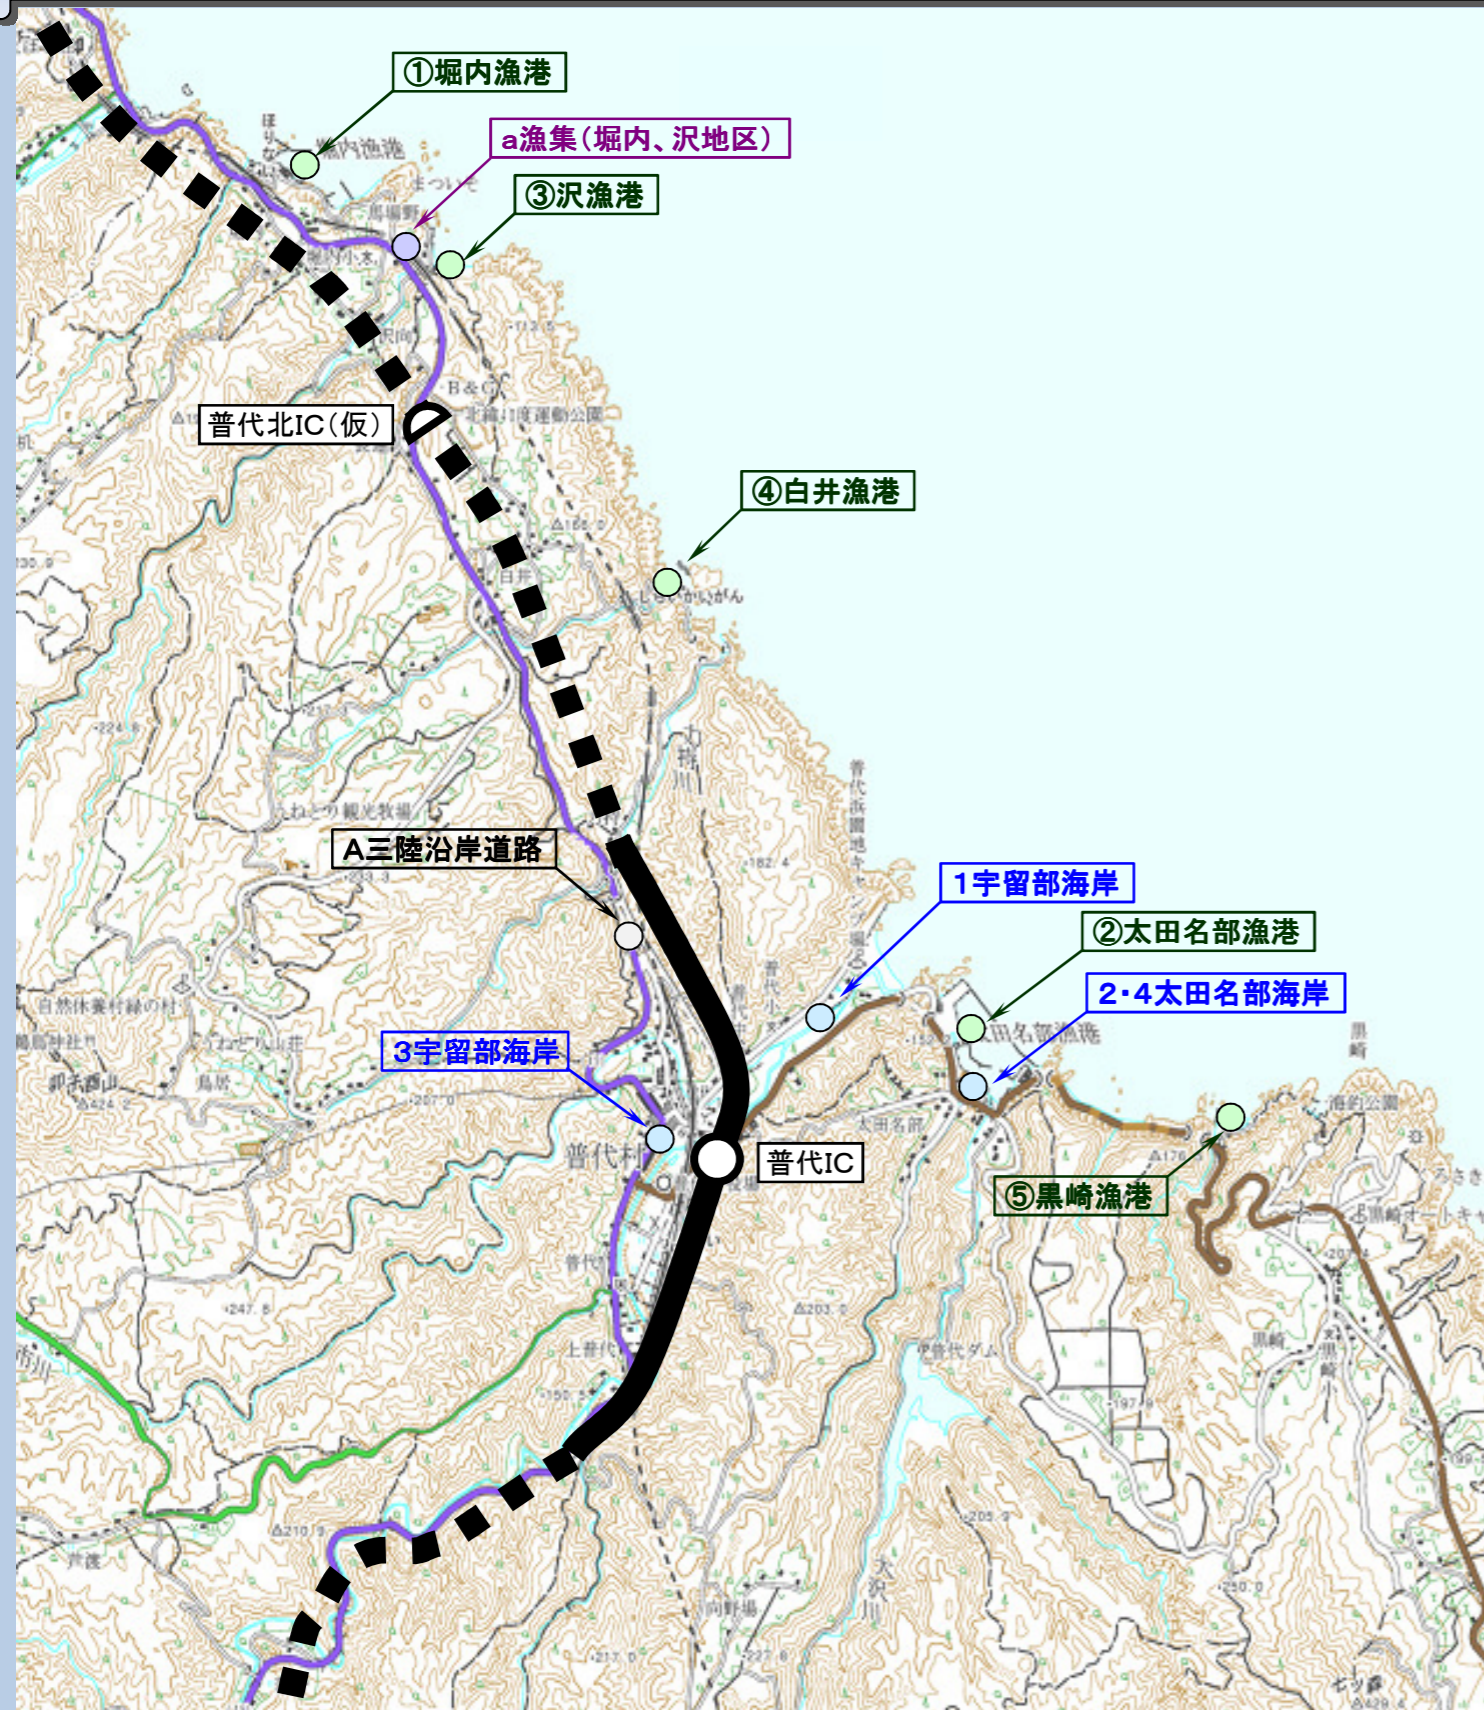


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇留部海岸	(災害復旧) 水門設備1式 他	■H25.10完成								
			2 太田名部海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km 他	■H24.10完成								
			3 宇留部海岸	(県単治水事業) 陸閘N=1基	■H25.10完成								
			4 太田名部海岸	(海岸危機) 陸閘等遠隔操作化 N=2基	用地、設計等	→	→	→	→	→	→	→	→
復興道路等	復興道路	国	野田久慈道路 (普代～久慈)				★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.27起工式						
			普代道路 (普代バイパス)	■H25.10.13供用開始									
			尾肝要普代道路 (尾肝要～普代)			★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.11.18起工式							
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 堀内、沢地区	避難路	用地、設計等	→	★工事						
漁港	漁港	県	① 堀内漁港	(漁港災害) 防波堤N=1式 他	■H25.10完成								
			② 太田名部漁港	(漁港災害) 防波堤L=285m、岸壁L=36m 他	■H25.10完成								
			③ 沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=77m 他	■H25.7完成								
			④ 白井漁港	(漁港災害) 防波堤L=89m、岸壁L=7m 他	■H24.6完成								
			⑤ 黒崎漁港	(漁港災害) 泊地N=1式	■H23.9完成								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【岩泉町】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

心はひとつ いのちの海に 未来を拓く岩泉

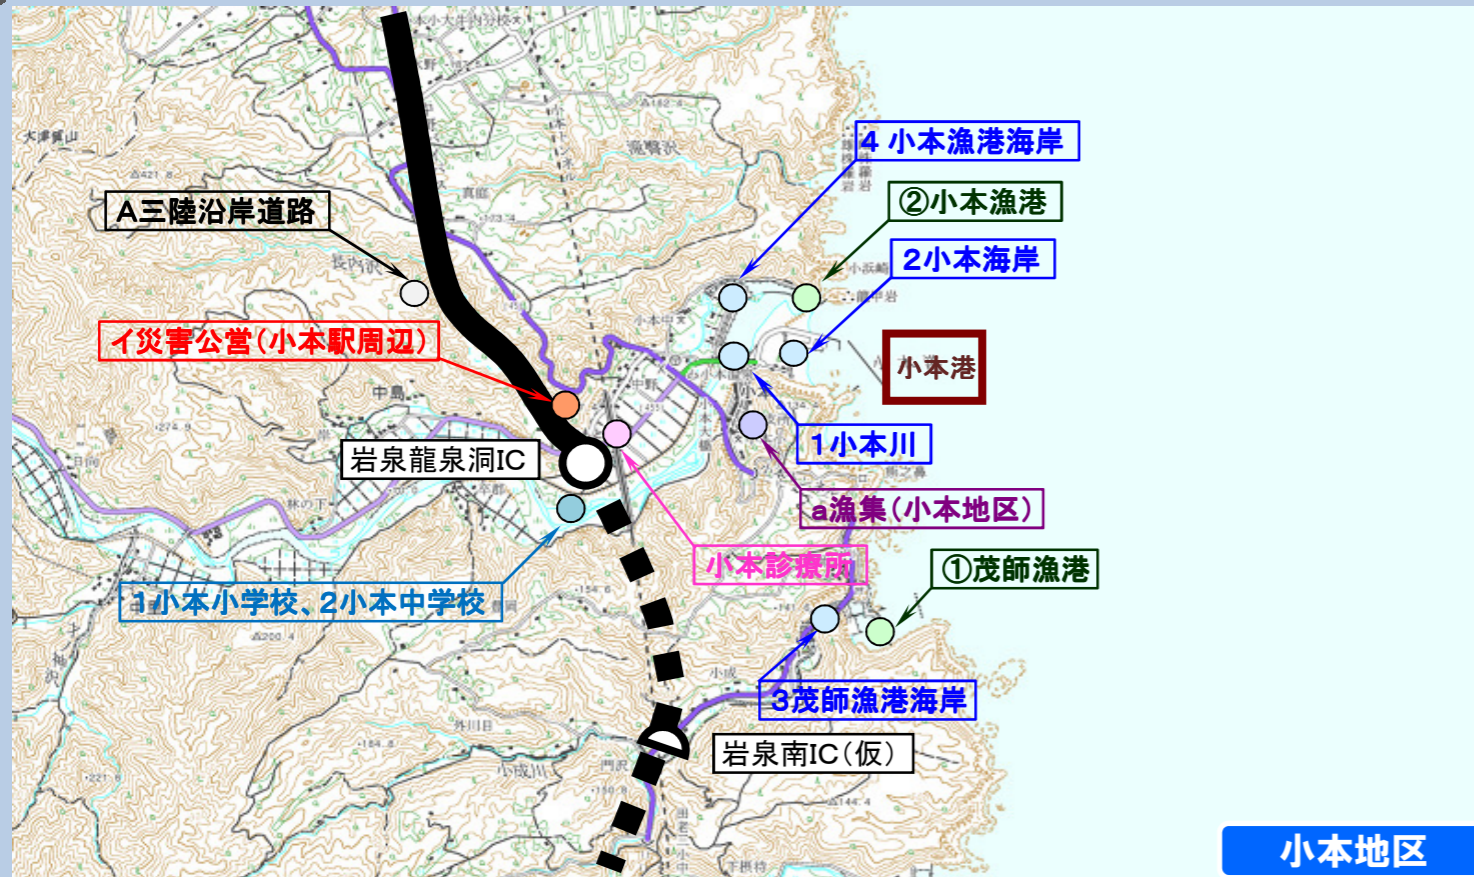

小本地区



岩泉地区




安家地区

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 (基金復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 小本川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.2km	用地、設計等	★工事						
			2 小本海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km	■H25.3完成							
	漁港海岸	町	3 茂師漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、水門N=1基 他	用地、設計等	★工事						
			4 小本漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	■H25.3完成							
復興道路等	復興支援道路	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路(田老～岩泉)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.3.27起工式							
		県	B (主) 久慈岩泉線	龍泉洞	■H24.8.28供用開始							
			大月峠	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.12着工								
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 小本地区	集落道、用地造成他 対象戸数:60戸 (民60戸)	用地、設計等	★工事						
			災害公営住宅	直接建設	町	ア 森の越(単独)	木造 予定戸数:15戸	■H25.5完成				
		町	イ 小本駅周辺(単独)		木造 予定戸数:20戸 RC造 予定戸数:16戸	■H26.3完成						
漁港	漁港	県	① 茂師漁港	(漁港災害) 防波堤L=493m、岸壁L=280m 他		★工事						
			町	② 小本漁港	(漁港災害) 防波堤L=103m、岸壁L=844m 他		★工事					
港湾	小本港	県	小本浜地区	(港湾災害復旧) 防波堤L=871m、岸壁L=119m、物揚場L=105m他		★工事						
医療	医科診療所	町	小本診療所	診療所施設整備		★工事						
教育	小学校	町	1 小本小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等	★工事				移転完了まで仮設校舎を使用		
	中学校		2 小本中学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等	★工事				移転完了まで仮設校舎を使用		

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市2/4】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

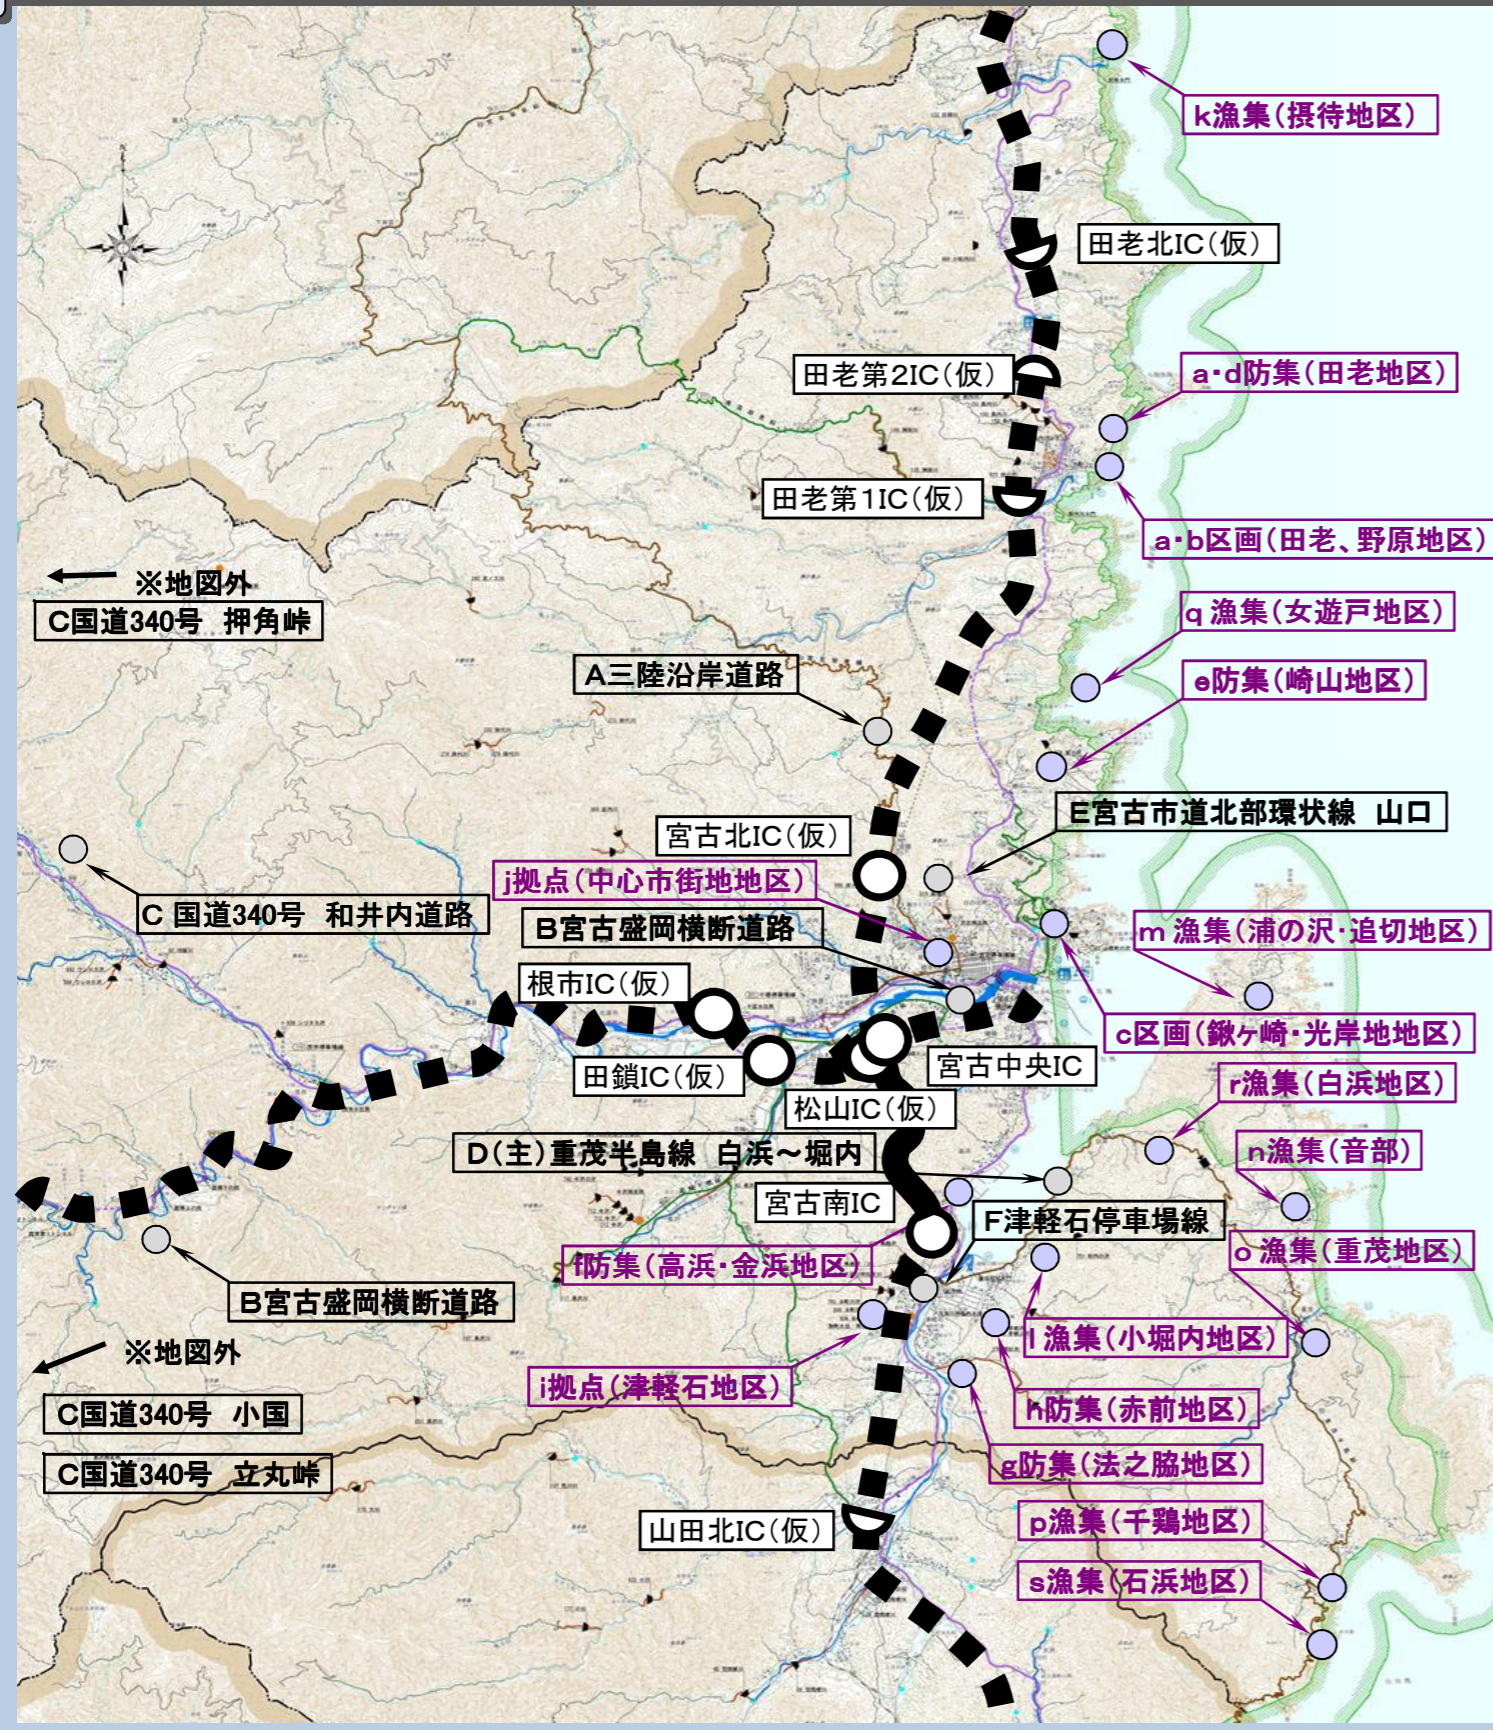


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間) H23 H24 H25			第2期 (本格復興期間) H26 H27		第3期 (更なる展開への連結期間) H28 H29 H30				
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路 (田老～岩泉) 宮古田老道路 (宮古中央～田老) 宮古道路 (宮古中央インター線) 山田宮古道路 (山田～宮古南)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.3.27起工式									
			B 宮古盛岡横断道路	宮古箱石道路 (宮古～箱石) 平津戸松草道路 (平津戸・岩井～松草) 区界道路 (区界～築川) 宮古西道路	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.11.30起工式									
			復興支援道路	県	C 国道340号	小国 和井内道路 立丸峠 押角峠	◆H25.11.29供用開始 ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.3着工							
					復興関連道路	市	D (主) 重茂半島線	白浜～堀内	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
							E 宮古市道北部環状線	山口	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			F (一) 津軽石停車場線	津軽石	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
	復興まちづくり	土地区画整理	市	a 田老地区	区域面積：19.0ha 対象戸数：220戸 (民180戸・公40戸)	用地、設計等 ★工事								
				b 野原地区	区域面積：15.8ha	用地、設計等 ★工事								
				c 鍛ヶ崎・光岸地地区	区域面積：23.8ha 対象戸数：270戸 (民230戸・公40戸)	用地、設計等 ★工事								
				d 田老地区	対象戸数：285戸 (民203戸・公82戸)	用地、設計等 ★工事								
				e 崎山地区 (大付)	対象戸数：約30戸 (民6戸・公24戸)	★H25.12完成								
				f 高浜・金浜地区	対象戸数：63戸 (民47戸・公16戸)	用地、設計等 ★工事								
防災集団移転		市	g 法之脇地区 (津軽石)	対象戸数：12戸 (民12戸)	★H26.3完成									
			h 赤前地区	対象戸数：56戸 (民56戸)	用地、設計等 ★工事									
			i 津軽石地区	区域面積：約1.2ha	用地、設計等 ★工事									
			j 中心市街地地区	区域面積：検討中	用地、設計等									
			k 摂待地区	集落道、用地造成他 対象戸数：3戸 (民3戸)	★H25.7完成									
			l 小堀内地区	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	★H26.3完成									
漁業集落防災機能強化		市	m 浦の沢・追切地区	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	★H25.3完成									
			n 音部地区	集落道、用地造成他 対象戸数：3戸 (民3戸)	★工事									
			o 重茂地区	集落道、用地造成他 対象戸数：20戸 (民16戸・公4戸)	★工事									
			p 千鶴地区	集落道、用地造成他 対象戸数：3戸 (民3戸)	★H25.12完成									
			q 女遊戸地区	集落道他	用地、設計等 ★工事									
			r 白浜地区	集落道他	用地、設計等 ★工事									
s 石浜地区	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	★工事												

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市3/4】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

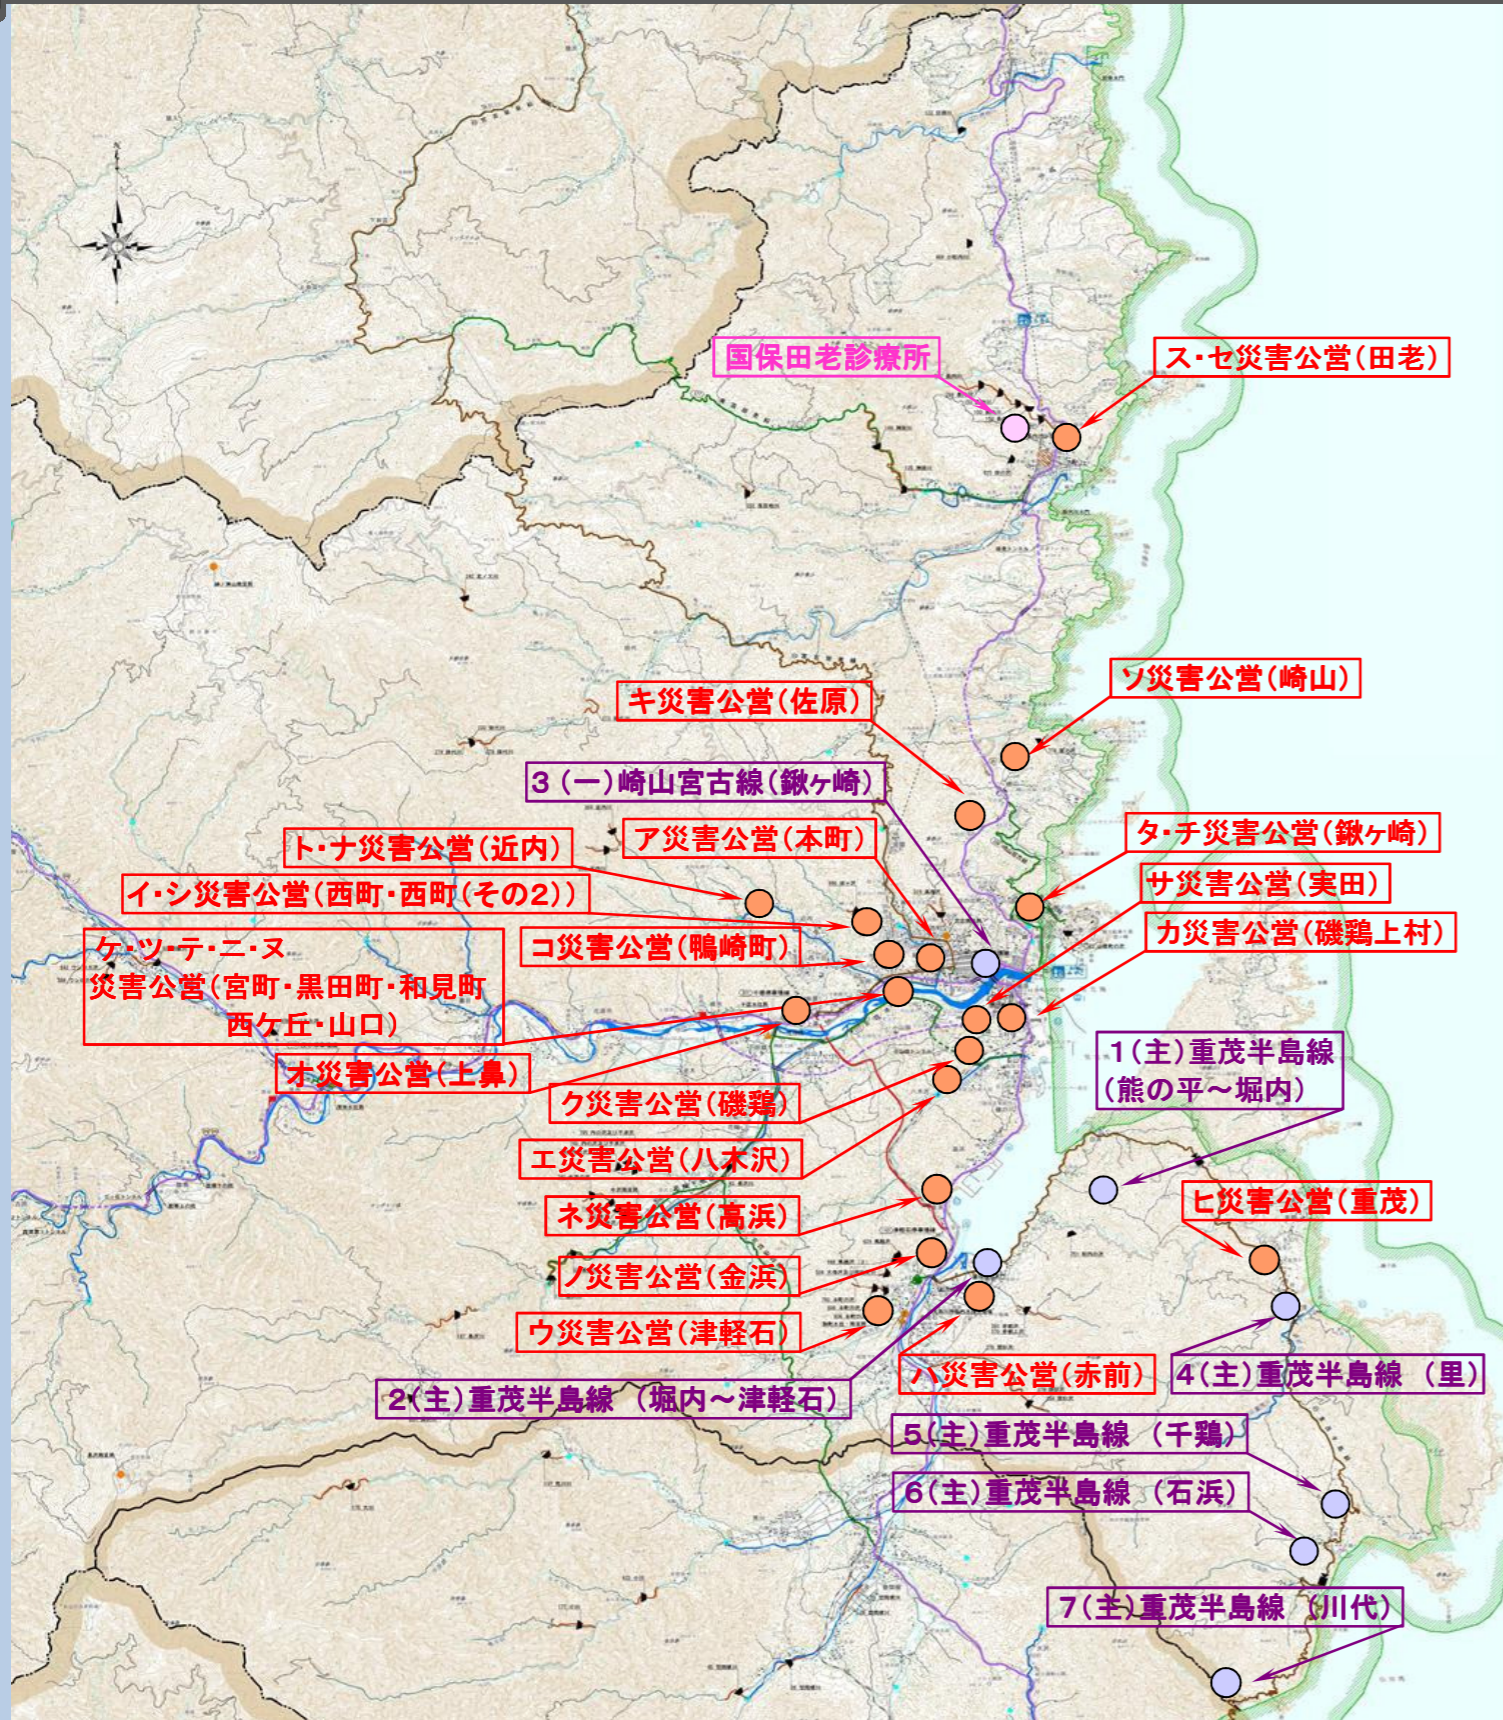


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基準復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (主)重茂半島線	熊の平～堀内	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
			2 (主)重茂半島線	堀内～津軽石	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
			3 (一)崎山宮古線	鍛ヶ崎	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
			4 (主)重茂半島線	里	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
			5 (主)重茂半島線	千鷲	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
			6 (主)重茂半島線	石浜	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
			7 (主)重茂半島線	川代	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
直接建設	設計・施工 一括選定	県	ア 本町 (単独)	RC造8階 予定戸数: 34戸	用地、設計等	工事							
			イ 西町 (単独)	RC造4階 予定戸数: 23戸	★工事	23戸							
			ウ 津軽石 (単独)	RC造5階 予定戸数: 35戸	用地、設計等	工事							
			エ 八木沢 (単独)	RC造5階 予定戸数: 50戸	★工事	50戸							
			オ 上鼻 (単独)	RC造5階 予定戸数: 30戸	用地、設計等	工事							
			カ 磯鷲上村 (単独)	予定戸数: 24戸	用地、設計等	工事							
			キ 佐原 (単独)	RC造 予定戸数: 50戸	★工事	50戸							
			ク 磯鷲 (単独)	S造 予定戸数: 30戸	★工事	30戸							
			ケ 宮町 (単独)	S造 予定戸数: 20戸	★工事	20戸							
			コ 鴨崎町 (単独)	S造3階 予定戸数: 20戸	用地、設計等	工事							
災害公営 住宅	敷地提案型 買取	市	ス 田老(高台) (防:田老地区)	RC造 予定戸数: 82戸	用地、設計等	工事							
			セ 田老 (区:田老地区)	予定戸数: 40戸	★工事	40戸							
			ソ 崎山 (防:崎山地区)	予定戸数: 24戸	★工事	24戸							
			タ 鍛ヶ崎 (単独)	予定戸数: 26戸	★工事	26戸							
			チ 鍛ヶ崎 (区:鍛ヶ崎地区)	予定戸数: 40戸	★工事	40戸							
			ツ 黒田町 (単独)	予定戸数: 24戸	★工事	24戸							
			テ 和見町 (単独)	予定戸数: 23戸	★工事	23戸							
			ト 近内 (単独)	RC造 予定戸数: 40戸	★H26.3完成	40戸							
			ナ 近内 (単独)	RC造 予定戸数: 40戸	★工事	40戸							
			ニ 西ヶ丘 (単独)	予定戸数: 24戸	★工事	24戸							
直接建設	市	市	又 山口 (単独)	予定戸数: 21戸	用地、設計等	工事							
			ネ 高浜 (単独)	予定戸数: 12戸	★	12戸							
			ノ 金浜 (防:金浜地区)	予定戸数: 16戸	用地、設計等	工事							
			ハ 赤前 (単独)	予定戸数: 14戸	★工事	14戸							
			ヒ 重茂 (漁:重茂地区)	予定戸数: 4戸	★工事	4戸							
			医療	医科診療所	市	国保田老診療所	診療所施設整備	用地、設計等	工事				

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

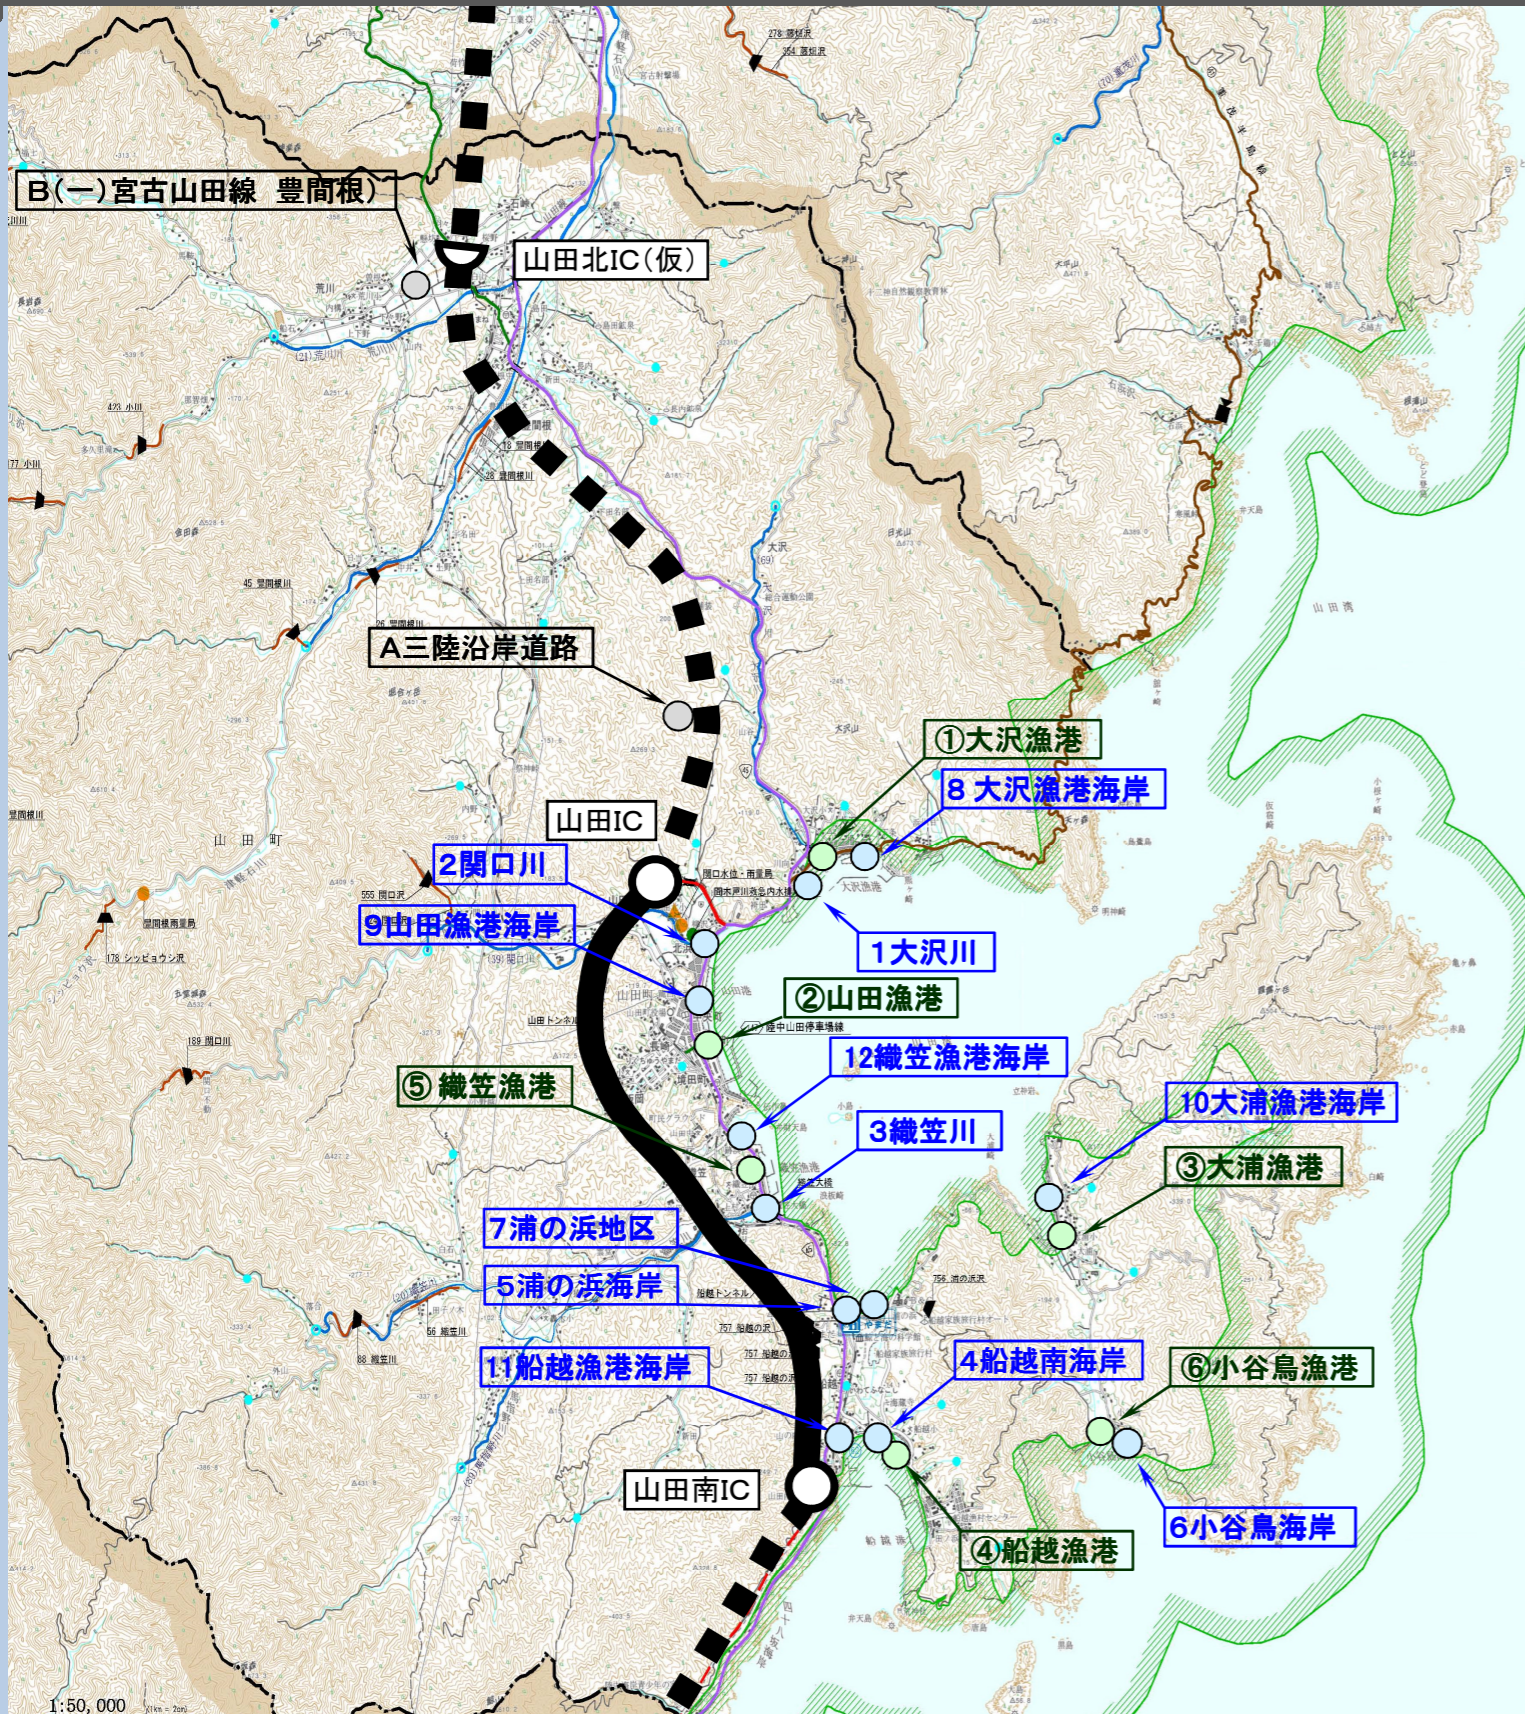


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール						
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等				★工事		
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基					★工事		
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基					★工事		
	農地海岸	県	4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等				★工事		
			5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基					★工事		
	漁港海岸	町	6 小谷鳥海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基					★工事		
			7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H25.3完成						
			8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=9基 他	用地、設計等					★工事	
			8-2 大沢(熊ヶ崎地区)他	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等					★工事	
			9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=1基 他	用地、設計等					★工事	
			9-2 山田(柳沢地区)他	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km	用地、設計等					★工事	
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、水門N=6基 他	用地、設計等					★工事	
11-1 船越漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=6基 他	用地、設計等					★工事		
11-2 船越(山ノ内地区)他			(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等					★工事		
12 織笠漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=2基 他	用地、設計等					★工事		
復興道路等	国	A 三陸沿岸道路(山田～宮古南)	山田宮古道路					★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			
		釜石山田道路						★用地・工事の推進			
復興支援道路	県	B(一)宮古山田線 豊間根						★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			
漁港	町	町	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他					★工事		
			② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他					★工事		
			③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他					★工事		
			④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他					★工事		
			⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、岸壁L=675m 他					★工事		
			⑥ 小谷鳥漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、岸壁L=176m 他					★工事		

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町3/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

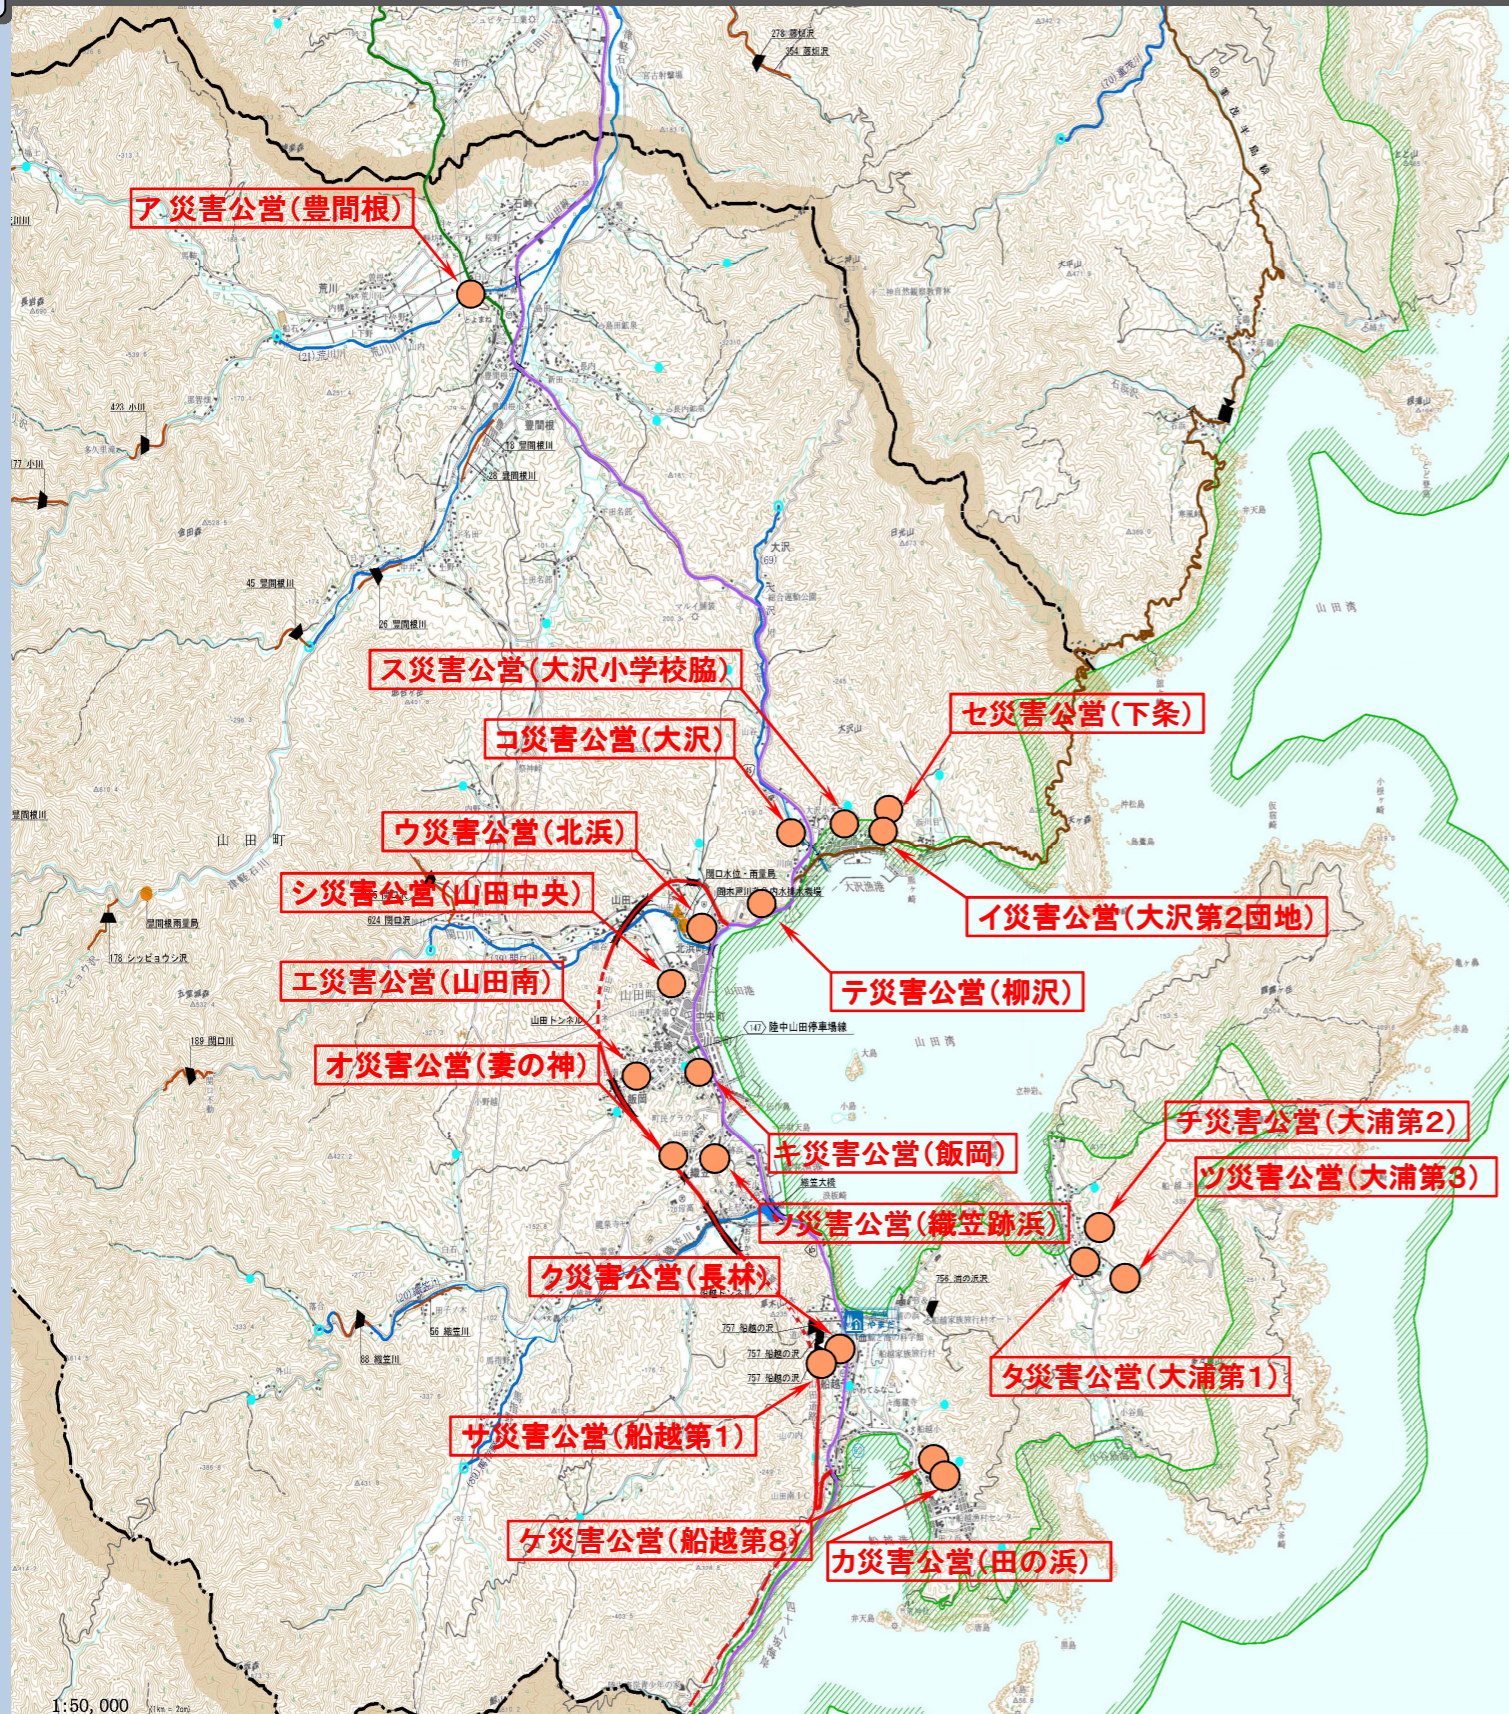

分区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
災害公営住宅	直接建設	県	ア 豊間根 (単独)	S造3階 予定戸数: 72戸			★工事						
			イ 大沢第2団地 (単独)	RC造 予定戸数: 20戸				用地、設計等・工事					
			ウ 北浜 (単独)	RC造5階 予定戸数: 90戸			用地、設計等		工事				
	設計・施工一括選定	県	エ 山田南 (防: 山田地区)	RC造 予定戸数: 70戸					用地、設計等・工事				
			オ 妻の神 (単独)	RC造 予定戸数: 70戸			用地、設計等		工事				
	直接建設	町	カ 田の浜 (単独)	予定戸数: 20戸					用地、設計等・工事				
			キ 飯岡 (防: 山田地区)	木造 予定戸数: 115戸					用地、設計等・工事				
			ク 長林 (防: 船越・田の浜地区)	木造 予定戸数: 21戸						用地、設計等・工事			
			ケ 船越第8 (防: 船越・田の浜地区)	木造 予定戸数: 13戸						用地、設計等・工事			
			コ 大沢 (単独)	RC造5階 予定戸数: 35戸					用地、設計等		工事		
ク 船越第1 (防: 船越地区)			予定戸数: 30戸						用地、設計等・工事				
シ 山田中央 (区: 山田地区)			RC造 予定戸数: 140戸						用地、設計等		工事		
直接建設	町	ス 大沢小学校脇 (漁: 大沢地区)	木造 予定戸数: 17戸					用地、設計等			工事		
		セ 下条 (漁: 大沢地区)	木造 予定戸数: 16戸					用地、設計等			工事		
		ソ 織笠跡浜 (防: 織笠地区)	木造 予定戸数: 22戸					用地、設計等			工事		
		タ 大浦第1 (単独)	木造 予定戸数: 9戸					用地、設計等			工事		
		チ 大浦第2 (漁: 大浦地区)	木造 予定戸数: 11戸					用地、設計等			工事		
		ツ 大浦第3 (漁: 大浦地区)	木造 予定戸数: 11戸					用地、設計等			工事		
		テ 柳沢 (改修) (単独)	予定戸数: 49戸								工事		

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町1/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール						
					第1期 (基金復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門等N=1基	用地、設計等				★工事		
			2 小槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門等N=1基	用地、設計等				★工事		
	林野海岸	県	3 浪板地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H24.10完成						
	漁港海岸	県	4 吉里吉里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=4基 他	用地、設計等				工事		
			5 大槌漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=3基 他	用地、設計等				★工事		
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路				★用地・工事の推進			
	復興関連道路	県	B (主) 大槌小国線	土坂の3				★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			
漁港	漁港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、岸壁L=753m 他	用地、設計等			★工事			
			② 大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m、岸壁L=2,582m 他	用地、設計等			★工事			
医療	病院	県	県立大槌病院	寺野地区ふれあい運動公園内	用地、設計等			工事			
教育	小学校	町	大槌小学校 安渡小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等			工事			H25 小学校4校統合(新校名:大槌小学校) 移転場所について、協議・調整中であるため、大よその予定を掲載。移転完了まで仮設校舎を使用。
	中学校	町	大槌中学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等			工事			移転場所について、協議・調整中であるため、大よその予定を掲載。移転完了まで仮設校舎を使用。
復興まちづくり	まちづくり連携道路	県	1 (-)吉里吉里釜石線	赤浜				測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町2/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
土地区画整理	a 町方地区			区域面積: 29.7ha 対象戸数: 808戸 (民651戸・公157戸)	用地、設計等				★工事							
	b 安渡地区			区域面積: 6.0ha 対象戸数: 191戸 (民104戸・公87戸)	用地、設計等				★工事							
	c 赤浜地区			区域面積: 7.6ha 対象戸数: 150戸 (民150戸)	用地、設計等				★工事							
	d 吉里吉里地区			区域面積: 9.1ha 対象戸数: 292戸 (民263戸・公29戸)	用地、設計等				★工事							
津波復興拠点	e 町方地区			区域面積 町方地区 (3.0ha)	用地、設計等				★工事							
	f 安渡地区			区域面積 安渡地区 (18.7ha)	用地、設計等				★工事							
復興まちづくり	防災集団移転	g 赤浜地区 (赤浜①団地)			対象戸数: 38戸 (民24戸・公14戸)	用地、設計等				★工事						
		h 赤浜地区 (赤浜②団地)			対象戸数: 40戸 (民34戸・公6戸)	用地、設計等				★工事						
		i 赤浜地区 (赤浜⑥団地)			対象戸数: 44戸 (民25戸・公19戸)	用地、設計等				★工事						
		j 吉里吉里地区 (吉里吉里①団地)			対象戸数: 21戸 (民21戸)	用地、設計等				★工事						
		k 吉里吉里地区 (吉里吉里②団地)			対象戸数: 38戸 (民38戸)	用地、設計等				★工事						
		l 吉里吉里地区 (吉里吉里③団地)			対象戸数: 14戸 (民14戸)	用地、設計等				★工事						
		m 浪板地区 (浪板①団地)			対象戸数: 13戸 (民13戸)	用地、設計等				★工事						
		n 安渡地区			対象戸数: 35戸 (民35戸)	用地、設計等				★工事						
		o 安渡地区 (安渡①団地)			対象戸数: 77戸 (民77戸)	用地、設計等				★工事						
		p 安渡地区 (安渡②団地)			対象戸数: 18戸 (民18戸)	用地、設計等				★工事						
		q 安渡地区 (安渡③団地)			対象戸数: 27戸 (民27戸)	用地、設計等				★工事						
		r 安渡地区 (安渡④団地)			対象戸数: 19戸 (民19戸)	用地、設計等				★工事						
		s 町方・小枕・伸松地区 (寺野団地)			対象戸数: 182戸 (民155戸・公27戸)	用地、設計等				★工事						
		t 町方・小枕・伸松地区 (大ヶ口、沢山、夏本、 榎内、屋敷前団地)			対象戸数: 77戸 (民77戸)	用地、設計等				★工事						
		u 町方・小枕・伸松地区 (町方団地)			対象戸数: 100戸 (民100戸)	用地、設計等				★工事						
		v 町方・小枕・伸松地区 (小枕団地)			対象戸数: 36戸 (民36戸)	用地、設計等				★工事						
		w 町方・小枕・伸松地区 (花輪田地区)			対象戸数: 10戸 (民10戸)	用地、設計等				★工事						
漁業集落防災機能強化	x 吉里吉里地区			漁業集落排水施設	用地、設計等				★工事							
	y 浪板地区			漁業集落排水施設、 用地造成、集落道他 対象戸数: 21戸 (民10戸・公11戸)	用地、設計等				★工事							
	z 安渡地区			集落道他	用地、設計等				★工事							
	aa 赤浜地区			用地造成、集落道他 対象戸数: 2戸 (民2戸)	用地、設計等				★工事							

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町3/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
直接建設	県		ア 吉里吉里 (単独)	RC造5階 予定戸数:34戸	34戸 ■H25.8完成									
			イ 大槌(桎内) (単独)	RC造 予定戸数:90戸	用地、設計等 → 90戸									
			ウ 大槌(屋敷前) (単独)	RC造5階 予定戸数:151戸	151戸 ★工事									
			エ 安渡二丁目 (区:安渡地区)	予定戸数:46戸	用地、設計等・工事 → 46戸									
			オ 大槌 (その他地区)	予定戸数:179戸	用地、設計等・工事 → 179戸									
買取	町	災害公営住宅	カ 大ケロ (単独)	木造 予定戸数:70戸	70戸 ■H25.8完成									
			キ 屋敷前 (単独)	木造 予定戸数:21戸	21戸 ■H25.11完成									
			ク 大ケロ2丁目 (単独)	木造 予定戸数:23戸	★工事 → 23戸									
			ケ 桎内 (単独)	木造 予定戸数:13戸	工事 → 13戸									
			コ 桎内 (単独)	木造 予定戸数:18戸	用地、設計等 → 18戸									
			カ 大ケロ (単独)	木造 予定戸数:27戸	用地、設計等 → 27戸									
			シ 町方 (区:町方地区)	予定戸数:52戸	用地、設計等 → 52戸									
			ス 町方 (区:町方地区)	予定戸数:18戸	用地、設計等 → 18戸									
			セ 町方 (区:町方地区)	予定戸数:20戸	用地、設計等 → 20戸									
			ソ 町方 (区:町方地区)	木造 予定戸数:67戸	用地、設計等 → 67戸									
			タ 吉里吉里 (区:吉里吉里地区)	木造 予定戸数:29戸	用地、設計等 → 29戸									
			チ 赤浜 (防:赤浜地区) 赤浜①団地	木造 予定戸数:14戸	用地、設計等 → 14戸									
			ツ 赤浜 (防:赤浜地区) 赤浜②団地	木造 予定戸数:6戸	用地、設計等 → 6戸									
			テ 赤浜 (防:赤浜地区) 赤浜⑥団地	木造 予定戸数:19戸	用地、設計等 → 19戸									
			ト 浪板 (漁:浪板地区)	木造 予定戸数:11戸	用地、設計等 → 11戸									
			ナ 浪板(1) (単独)	木造 予定戸数:4戸	用地、設計等 → 4戸									
			ニ 安渡 (区:安渡地区)	木造 予定戸数:20戸	用地、設計等 → 20戸									
			ヌ 安渡 (区:安渡地区)	木造 予定戸数:21戸	用地、設計等 → 21戸									
			ネ 町方 (防:寺野地区)	木造 予定戸数:16戸	用地、設計等 → 16戸									
			ノ 町方 (防:寺野地区)	木造 予定戸数:11戸	用地、設計等 → 11戸									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市1/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール					
					第1期 (基準復興期間) H23 H24 H25	第2期 (本格復興期間) H26 H27		第3期 (更なる展開への連結期間) H28 H29 H30		
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 甲子川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等	★工事				
			2 鶴住居川	(災害復旧) 水門等N=1基	用地、設計等	★工事				
			3 片岸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、陸間等N=1基	用地、設計等	★工事				
			4 水海海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基、離岸堤L=280m	★工事					
	農地海岸	県	5 小白浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門等N=2基	用地、設計等	★工事				
			6 釜石港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.1km、水門等N=19基	★工事					
			7 本郷海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	★工事					
			8 下荒川海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	用地、設計等	★工事				
	林野海岸	県	9 根浜地区	(治山施設災害復旧) 防潮堤L=0.6km	用地、設計等	★工事				
			10 箱崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	用地、設計等	★工事				
	漁港海岸	市	11 白浜(鶴)漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=3基 他	用地、設計等	★工事				
			12 両石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=1基 他	用地、設計等	★工事				
			13 釜石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.8km、水門N=6基 他	用地、設計等	★工事				
			14 小白浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=1基 他	用地、設計等	★工事				
			15 室浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	用地、設計等	★工事				
			16 仮宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km	用地、設計等	★工事				
			17 桑の浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等	★工事				
			18 嬉石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	用地、設計等	★工事				
			19 平田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=1基 他	用地、設計等	★工事				
			20 白浜(釜石)漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等	★工事				
			21 佐須漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	用地、設計等	★工事				
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路	★用地・工事の推進					
			吉浜釜石道路(吉浜～釜石)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.2.25起工式						
	復興支援道路	県	B 東北横断自動車道 釜石秋田線	釜石道路(釜石～釜石西)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H24.11.4起工式					
			C (一) 水海大渡線	女遊部	◆H24.3完成					
	復興関連道路	県	D (主) 釜石遠野線	剣	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.9着工					
			E (一) 桜峠平田線	平田	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.10着工					
F (一) 吉浜上荒川線	下荒川	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H24.10着工								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市2/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

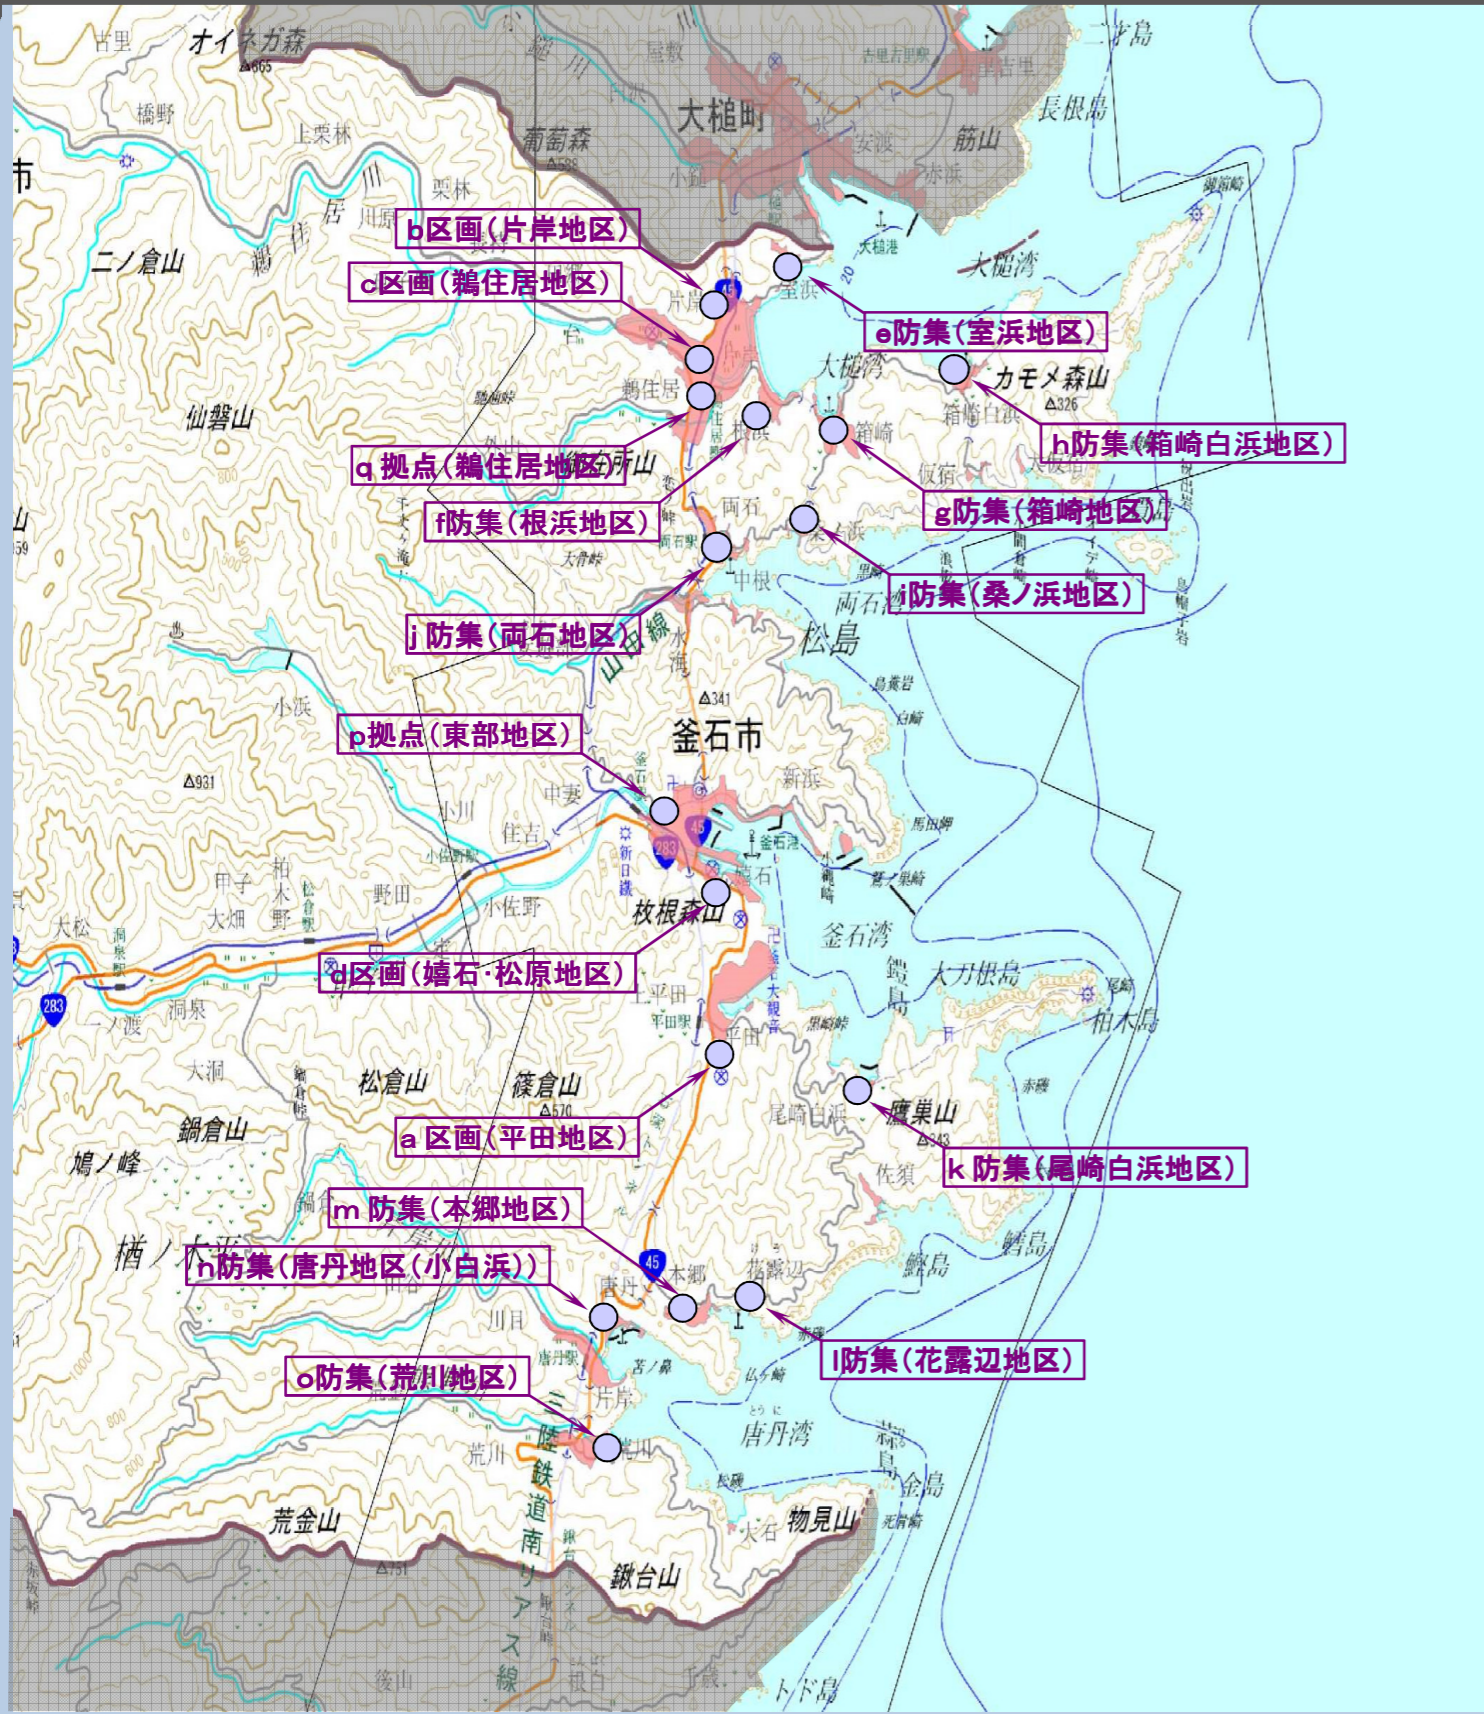


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 (基準復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
復興 まちづくり	土地区画整理	市	a 平田地区	区域面積：22.7ha 対象戸数：288戸 (民288戸)	用地、設計等							
			b 片岸地区	区域面積：22.7ha 対象戸数：144戸 (民125戸・公19戸)	★工事							
			c 鶴住居地区	区域面積：49.1ha 対象戸数：700戸 (民580戸・公120戸)	用地、設計等							
			d 嬉石・松原地区	区域面積：12.9ha 対象戸数：400戸 (民250戸・公150戸)	★工事							
			e 室浜地区	対象戸数：10戸 (民7戸・公3戸)	用地、設計等			民7戸	公3戸			
			f 根浜地区	対象戸数：36戸 (民27戸・公9戸)	用地、設計等			民27戸	公9戸			
			g 箱崎地区	対象戸数：30戸 (民18戸・公12戸)	用地、設計等					民18戸	公12戸	
			h 箱崎白浜地区	対象戸数：7戸 (民7戸)	用地、設計等					民7戸		
			i 桑ノ浜地区	対象戸数：13戸 (民6戸・公7戸)	用地、設計等					民6戸	公7戸	
	防災集団移転	市	j 両石地区	対象戸数：68戸 (民34戸・公34戸)	用地、設計等							
			k 尾崎白浜地区	対象戸数：3戸 (民3戸)	★工事							
			l 花露辺地区	対象戸数：17戸 (民4戸・公13戸)	民4戸・公13戸 ■H25.12完成							
			m 本郷地区	対象戸数：15戸 (民8戸・公7戸)	用地、設計等							
			n 唐丹地区(小白浜)	対象戸数：25戸 (民25戸)	★工事							
			o 荒川地区	対象戸数：10戸 (民2戸・公8戸)	用地、設計等							
			p 東部地区	区域面積：26.8ha	★工事							
			q 鶴住居地区	区域面積：18.4ha	★工事							
			津波復興拠点	市			用地、設計等					
		★工事										

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市3/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

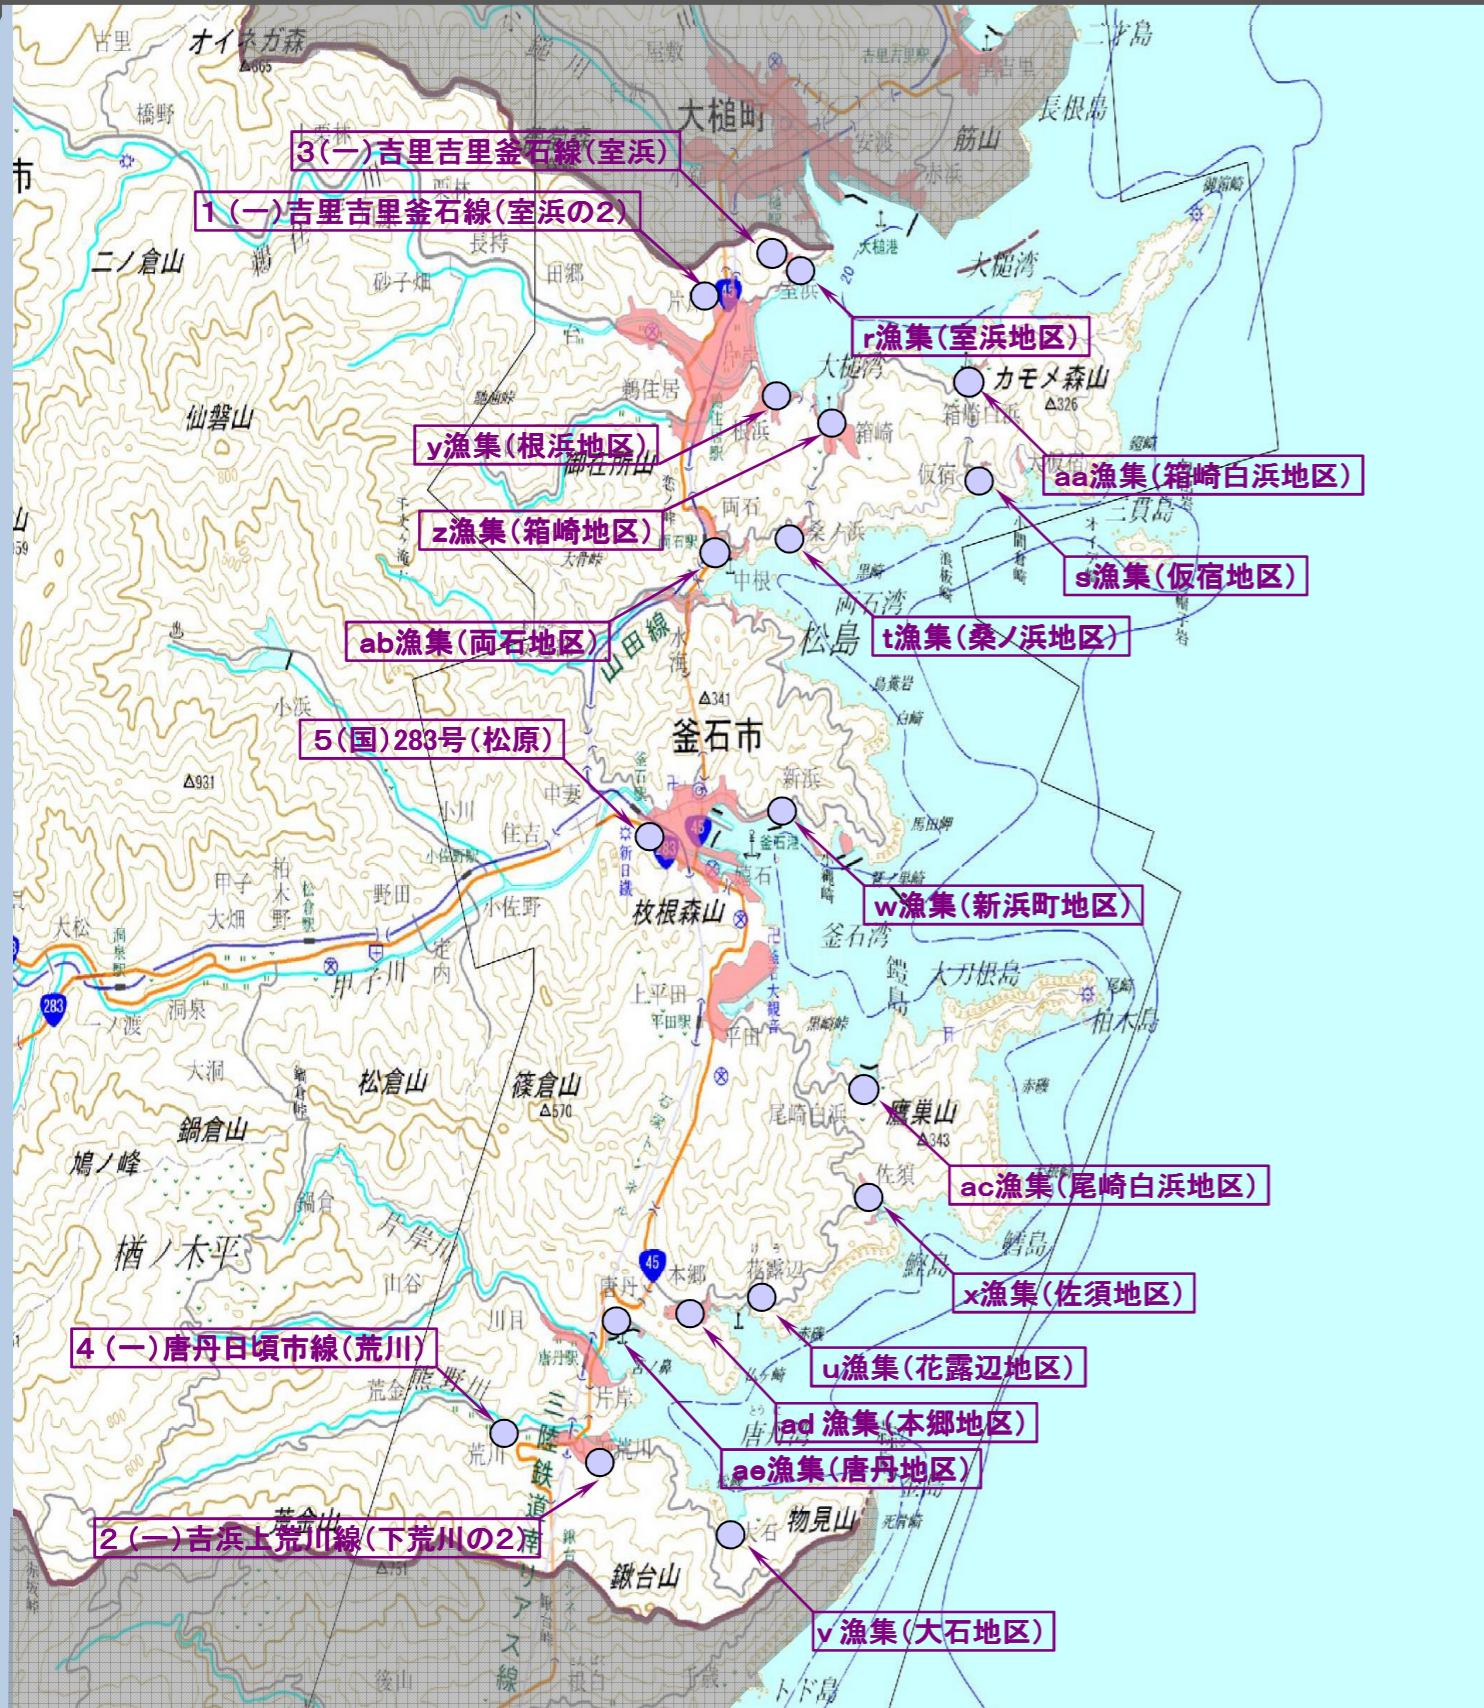


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール													
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)						
					H23	H24	H25	H26		H27		H28	H29	H30				
復興 まちづくり	漁業集落防災 機能強化	市	r 室浜地区	集落道 他 対象戸数:17戸 (民11戸・公6戸)	用地、設計等				民11戸		公6戸							
			s 仮宿地区	集落道、用地造成 他 対象戸数4戸 (民4戸)	用地、設計等					民4戸								
			t 桑ノ浜地区	集落道 他 対象戸数:10戸 (民5戸・公5戸)	用地、設計等								民5戸		公5戸			
			u 花露辺地区	集落道 他	用地、設計等													
			v 大石地区	集落道 他	用地、設計等													
			w 新浜町地区	用地造成他	用地、設計等													
			x 佐須地区	用地造成他 対象戸数:6戸 (民4戸・公2戸)	用地、設計等						民4戸					公2戸		
			y 根浜地区	用地造成他 対象戸数:8戸 (民4戸・公4戸)	用地、設計等							民4戸					公4戸	
			z 箱崎地区	用地造成他 対象戸数:35戸 (民18戸・公17戸)	用地、設計等												民18戸・公17戸	
			aa 箱崎白浜地区	集落道 他 対象戸数:3戸 (民3戸)	用地、設計等												民3戸	
			ab 両石地区	用地造成他 対象戸数:57戸 (民36戸・公21戸)	用地、設計等												民36戸	公21戸
			ac 尾崎白浜地区	避難路 他 対象戸数:2戸 (民2戸)	用地、設計等												民2戸	
			ad 本郷地区	用地造成他 対象戸数9戸 (民4戸・公5戸)	用地、設計等												民4戸・公5戸	
			ae 唐丹地区	集落排水施設整備 L=3,353m 処理施設整備1式	用地、設計等													
			まちづくり 連携道路	県	1 (一) 吉里吉里釜石線	室浜の2												
2 (一) 吉浜上荒川線	下荒川の2															測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手		
3 (一) 吉里吉里釜石線	室浜															測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手		
4 (一) 唐丹日頃市線	荒川															測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手		
5 (国)283号	松原															★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.10着工		

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市4/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

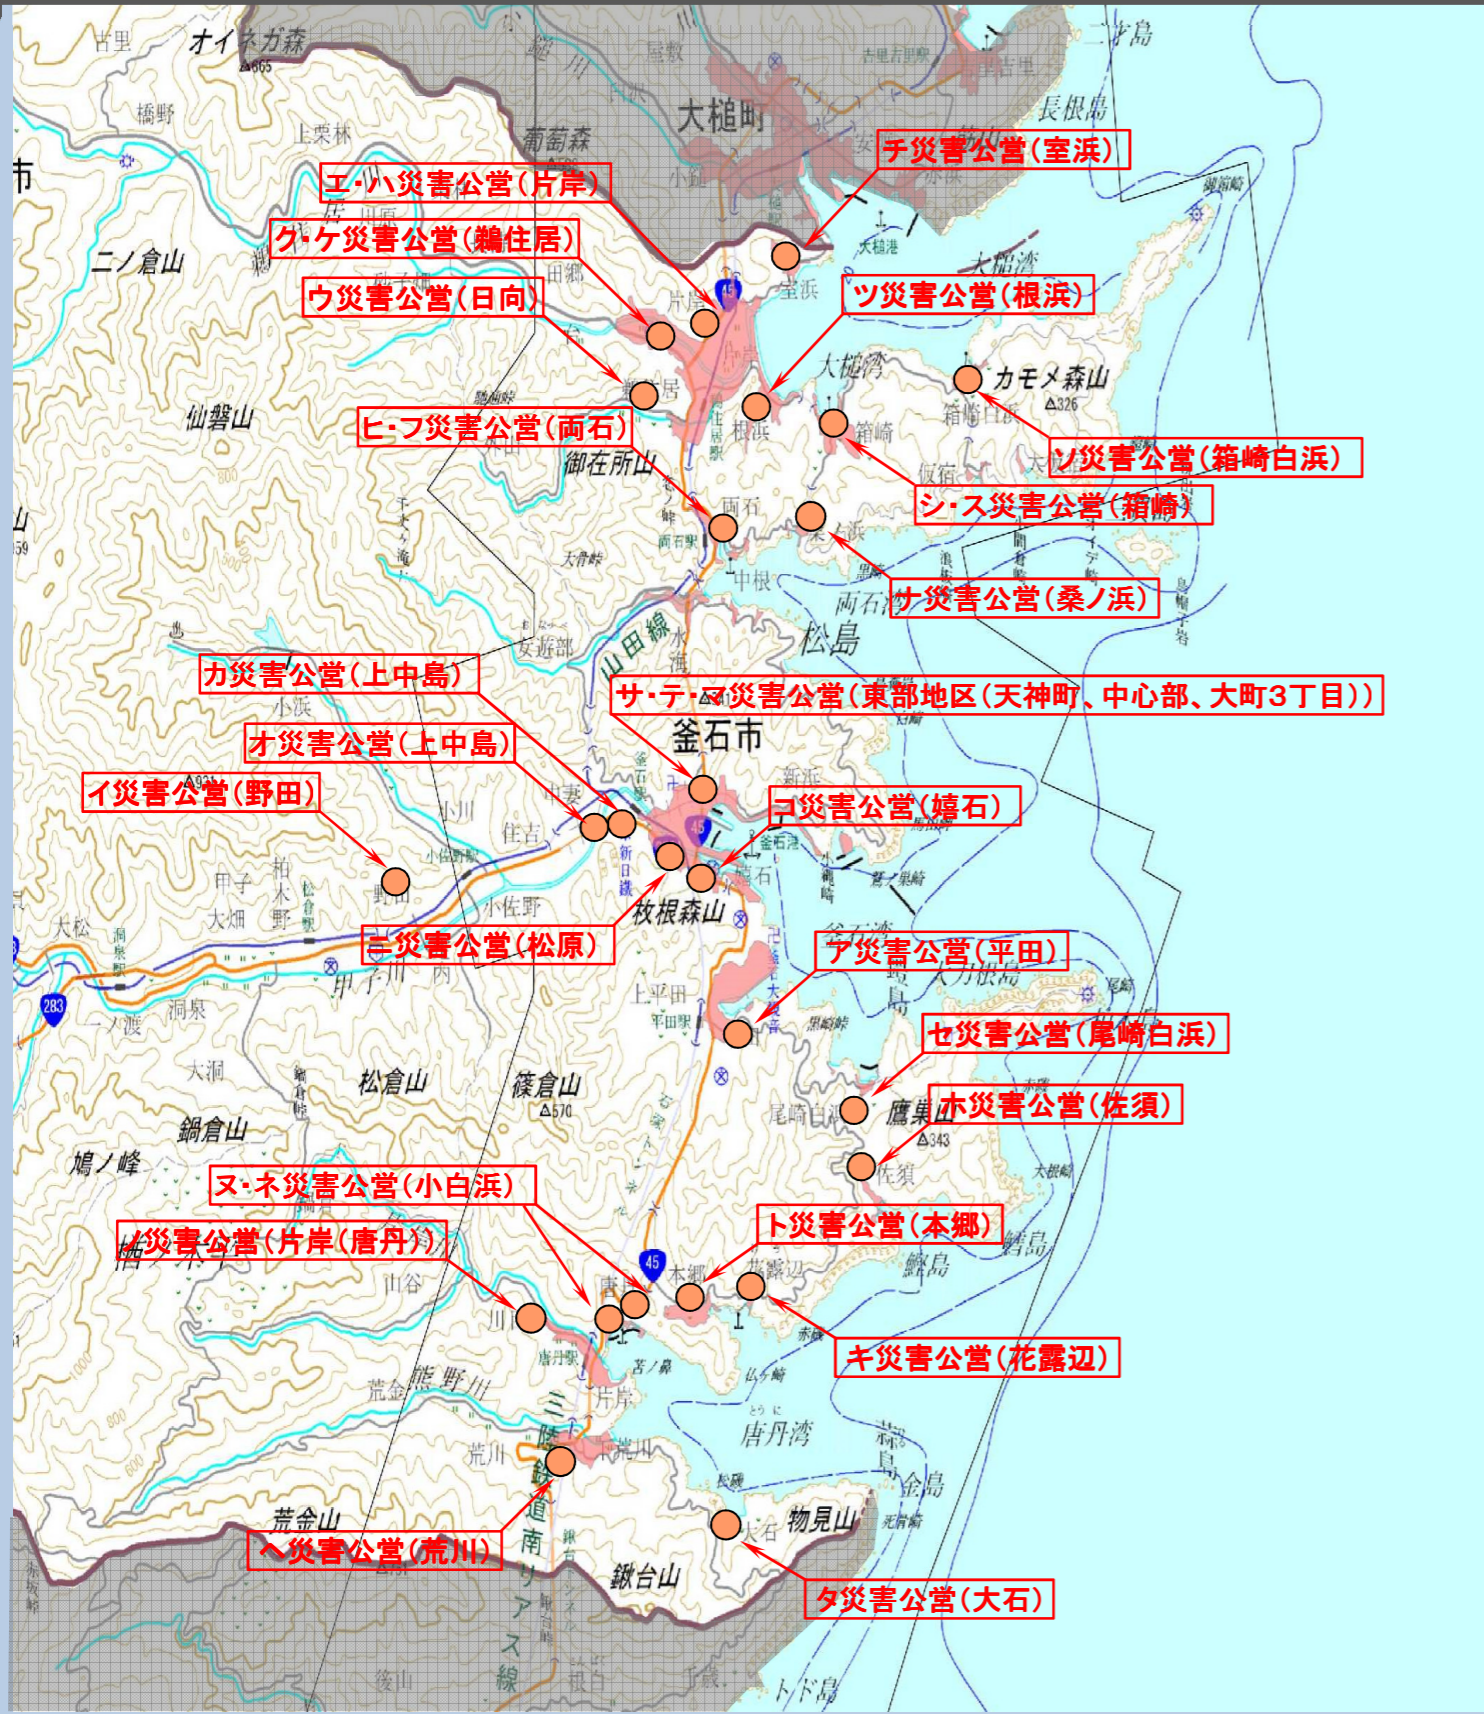


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基準復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
直接建設	県	ア	平田(単独)	RC造7階 予定戸数:126戸			126戸 ■H26.1完成							
		イ	野田(単独)	RC造5階 予定戸数:32戸			32戸 ■H25.10完成							
		ウ	日向(単独)	RC造5階 予定戸数:30戸				30戸 用地、設計等						
		エ	片岸(単独)	RC造 予定戸数:22戸					22戸 用地、設計等					
買収	市	オ	上中島(単独)	S造 予定戸数:54戸			54戸 ■H25.3完成							
		カ	上中島(単独)	S造 予定戸数:156戸				156戸 ★工事						
		キ	花露辺(防:花露辺地区)	RC造 予定戸数:13戸			13戸 ■H25.12完成							
		ク	鶴住居(区:鶴住居地区)	RC造 予定戸数:80戸				用地、設計等		80戸 工事				
		ケ	鶴住居(区:鶴住居地区)	木造 予定戸数:40戸				用地、設計等		40戸 工事				
		コ	嬉石(区:嬉石・松原地区)	RC造 予定戸数:86戸				用地、設計等		86戸 工事				
		サ	東部地区(天神町)(単独)	S造 予定戸数:50戸				用地、設計等		50戸 工事				
		シ	箱崎(防:箱崎地区)	木造 予定戸数:17戸				用地、設計等		17戸 工事				
		ス	箱崎(防:箱崎地区)	木造 予定戸数:12戸				用地、設計等		12戸 工事				
		セ	尾崎白浜(単独)	木造 予定戸数:5戸				用地、設計等		5戸 工事				
		ソ	箱崎白浜(単独)	木造 予定戸数:9戸				9戸 ■H26.3完成						
		タ	大石(単独)	木造 予定戸数:3戸				3戸 ■H25.12完成						
		チ	室浜(防:室浜地区)	木造 予定戸数:9戸					9戸 用地、設計等		9戸 工事			
		ツ	根浜(防:根浜地区)	木造 予定戸数:13戸					13戸 用地、設計等		13戸 工事			
		直接建設	市	テ	東部地区(中心部)(単独)	RC造 予定戸数:336戸				336戸 用地、設計等		336戸 工事		
				ト	本郷(防:本郷地区)	木造 予定戸数:12戸				12戸 用地、設計等		12戸 工事		
ナ	桑ノ浜(防:桑ノ浜地区)			木造 予定戸数:12戸				12戸 用地、設計等		12戸 工事				
ニ	松原(区:嬉石・松原地区)			RC造 予定戸数:64戸				64戸 用地、設計等		64戸 工事				
ヌ	小白浜(単独)			S造 予定戸数:27戸				27戸 用地、設計等		27戸 工事				
ネ	小白浜(単独)			木造 予定戸数:3戸				3戸 用地、設計等		3戸 工事				
ノ	唐丹片岸(単独)			木造 予定戸数:6戸				6戸 用地、設計等		6戸 工事				
ハ	片岸(区:片岸地区)			木造 予定戸数:19戸				19戸 用地、設計等		19戸 工事				
ヒ	両石(防:両石地区)(漁:両石地区)			RC造 予定戸数:30戸				30戸 用地、設計等		30戸 工事				
フ	両石(防:両石地区)(漁:両石地区)			木造 予定戸数:25戸				25戸 用地、設計等		25戸 工事				
ヘ	荒川(防:荒川地区)			木造 予定戸数:8戸				8戸 用地、設計等		8戸 工事				
ホ	佐須(漁:佐須地区)			木造 予定戸数:2戸				2戸 用地、設計等		2戸 工事				
マ	東部(大町3丁目)(単独)	予定戸数:44戸				44戸 工事								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市5/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

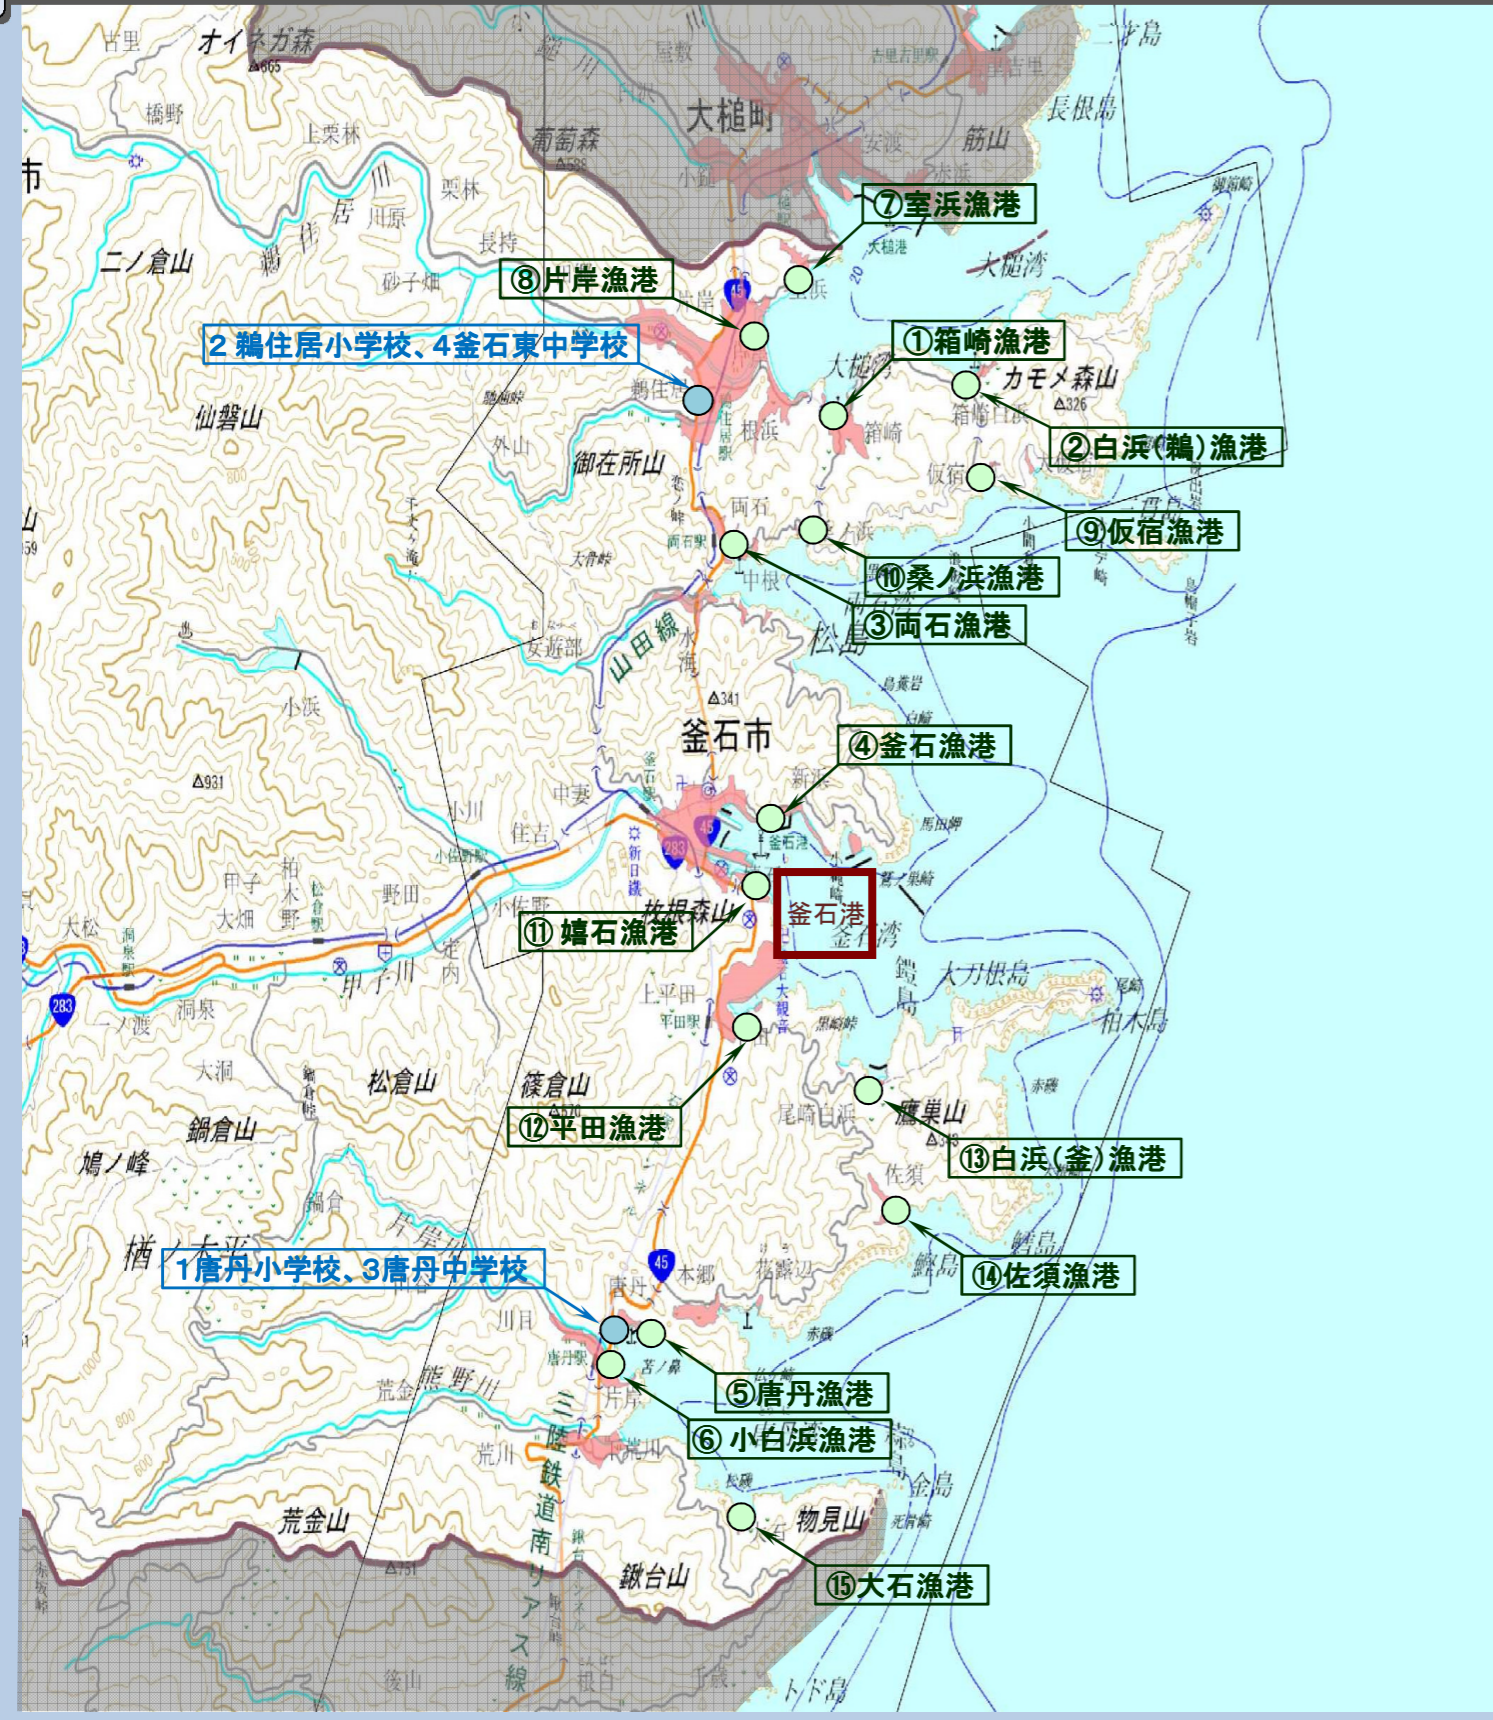


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本特復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
漁港	漁港	県	① 箱崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=624m、岸壁L=889m 他				★工事								
			② 白浜(輪)漁港	(漁港災害) 防波堤L=505m、岸壁L=504m 他				★工事								
			③ 両石漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、岸壁L=834m 他				★工事								
			④ 釜石漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,120m、岸壁L=1,898m 他				★工事								
			⑤ 唐丹漁港	(漁港災害) 防波堤L=623m、岸壁L=572m 他				★工事								
			⑥ 小白浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=819m、岸壁L=834m 他				★工事								
		市	⑦ 室浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=163m、岸壁L=190m 他	用地、設計等				★工事							
			⑧ 片岸漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、岸壁L=135m 他	用地、設計等				工事							
			⑨ 仮宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=130m、岸壁L=60m 他					★工事							
			⑩ 桑ノ浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=209m、岸壁L=250m 他					★工事							
			⑪ 嬉石漁港	(漁港災害) 防波堤L=76m、岸壁L=304m 他	用地、設計等				★工事							
			⑫ 平田漁港	(漁港災害) 防波堤L=215m、岸壁L=598m 他					★工事							
			⑬ 白浜(釜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=449m、岸壁L=378m 他	用地、設計等				★工事							
			⑭ 佐須漁港	(漁港災害) 防波堤L=174m、岸壁L=103m 他	用地、設計等				★工事							
			⑮ 大石漁港	(漁港災害) 防波堤L=361m、岸壁L=233m 他	用地、設計等				★工事							
港湾	釜石港	国 A 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=1,660m				★工事(平成27年度完成予定)									
		県 B 須賀地区	(災害復旧) 南防波堤L=266m、-4.0m1号物揚場L=200m、-7.5m岸壁L=152m他				★工事									
教育	小学校	市	1 唐丹小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等				工事					4校とも移転完了まで仮設校舎を使用		
			2 鶺住居小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等				★工事							
	中学校	3 唐丹中学校	(災害復旧) 現敷地で新築	用地、設計等				工事								
		4 釜石東中学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等				★工事								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市1/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

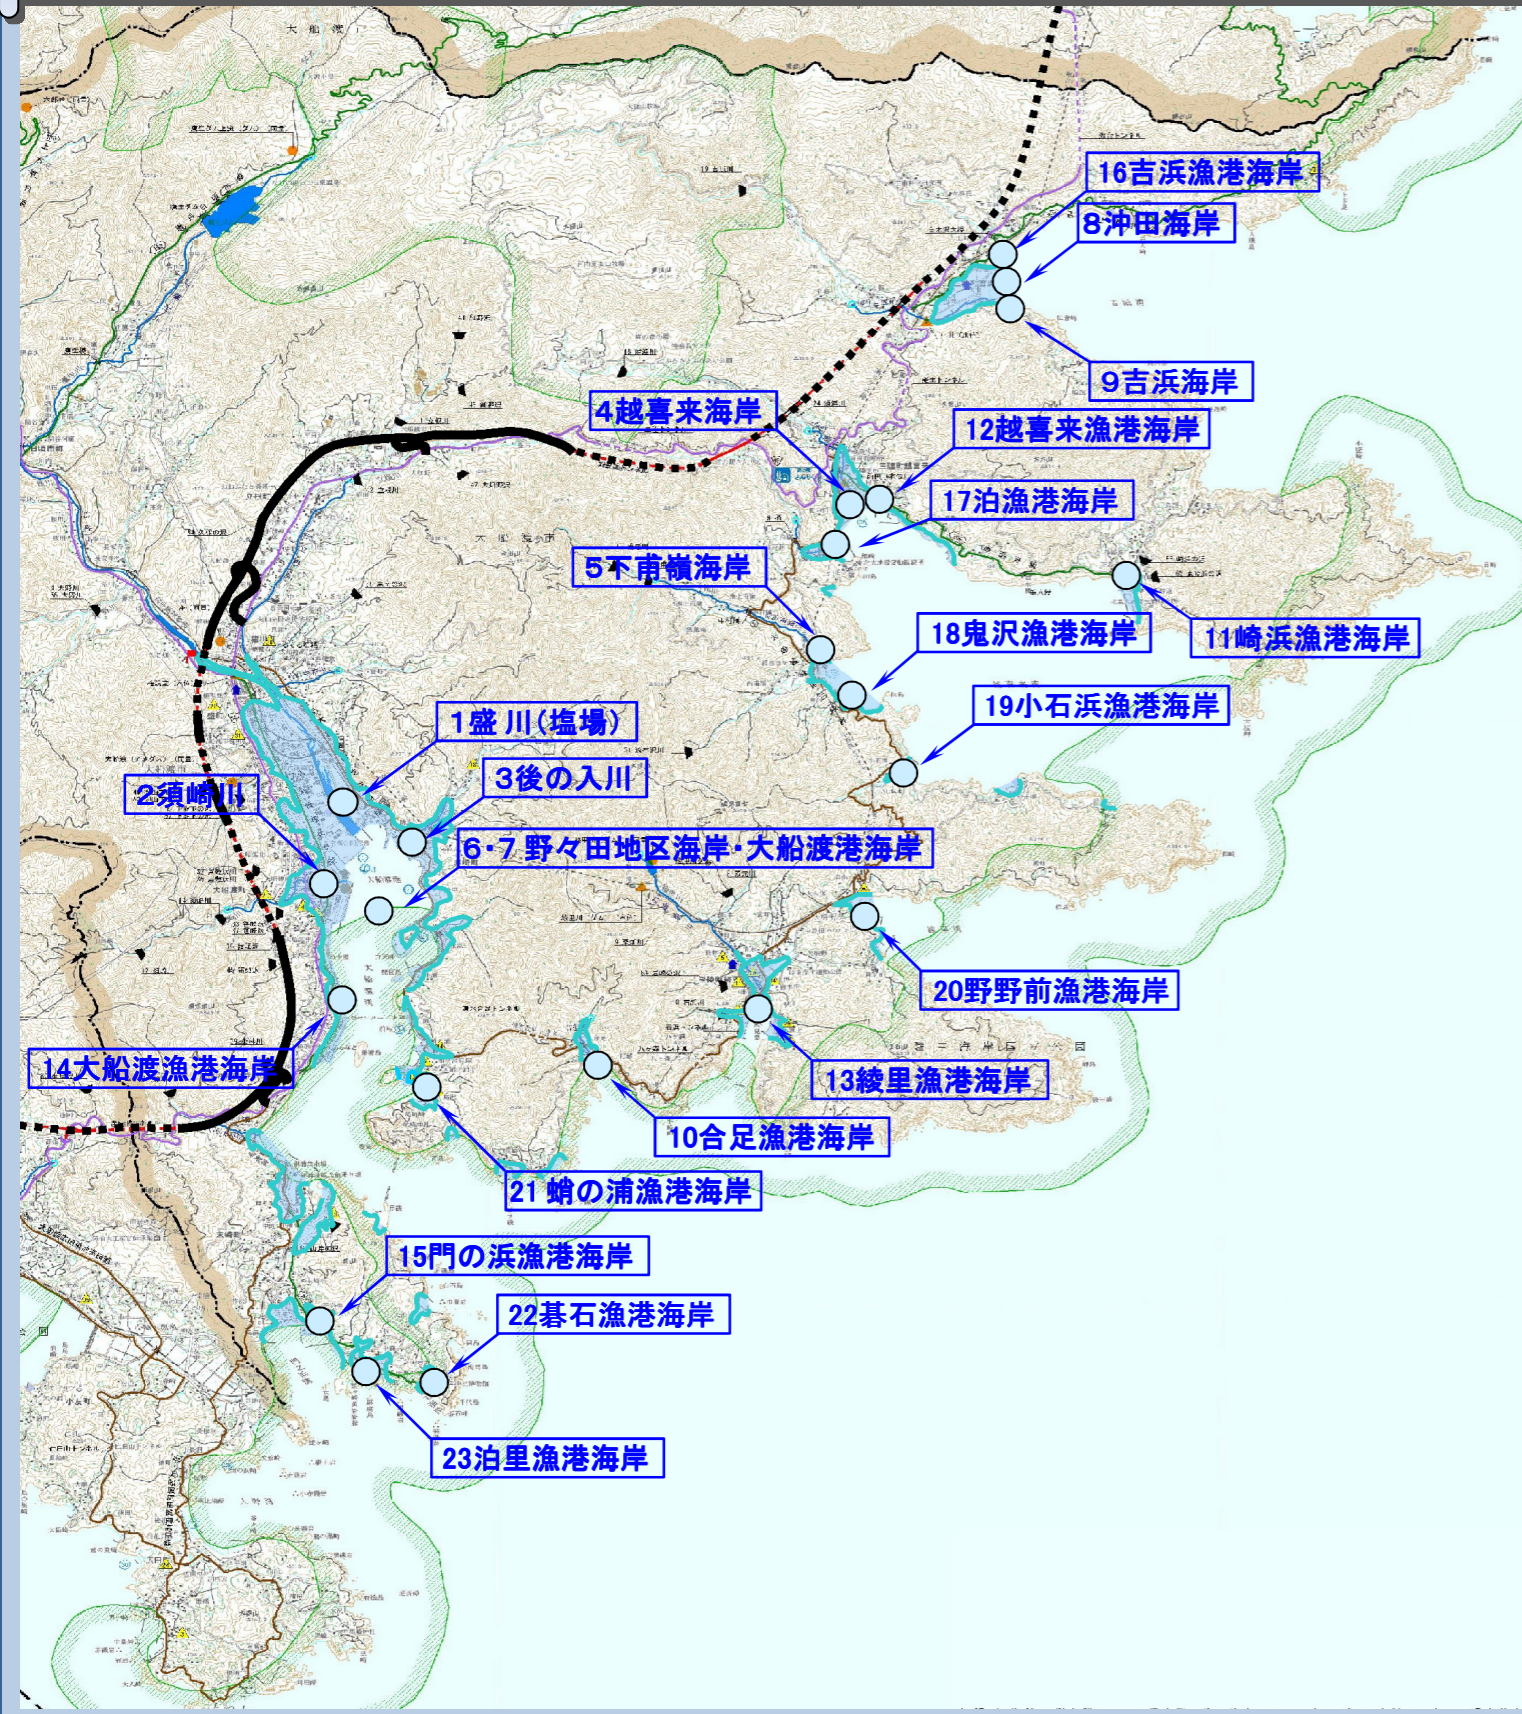


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 盛川(塩場)	(災害復旧) 防潮堤L=2.3km	★工事							
			2 須崎川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等	★工事						
			3 後の入川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等				工事			
			4 越喜来海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、水門N=2基他	★工事							
			5 下甫嶺海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=2基他	★工事							
			6 野々田地区海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=4.1km	用地、設計等				★工事			
			7 大船渡港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.6km、水門等N=38基	用地、設計等				★工事			
	農地海岸	市	8 沖田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km	■H25.6完成							
			9 吉浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km、水門等N=2基	用地、設計等	★工事						
			10 合足海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km、水門等N=2基	用地、設計等	★工事						
			11 崎浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=3基 他	用地、設計等	★工事						
			12 越喜来漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基 他	★工事							
			13-1 綾里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、水門N=3基 他	用地、設計等				工事			
	漁港海岸	市	13-2 綾里(石浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km	用地、設計等				工事			
			14-1 大船渡漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.6km、水門N=11基 他	用地、設計等	★工事						
			14-2 大船渡(細浦他地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=2.8km、水門N=1基 他	用地、設計等				工事			
			15 門の浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.5km、水門N=2基 他	用地、設計等	★工事						
			16 吉浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	用地、設計等	★工事						
			17 泊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等	★工事						
			18 鬼沢漁港海岸	(災害復旧) 海岸護岸L=0.1km	用地、設計等	★工事						
			19 小石浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	用地、設計等				工事			
			20 野野前漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=2基 他	用地、設計等				工事			
			21 蛸ノ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=6基 他	用地、設計等				工事			
市	市	22 基石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	用地、設計等				工事				
		23 泊里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基 他	用地、設計等				工事				

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市3/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

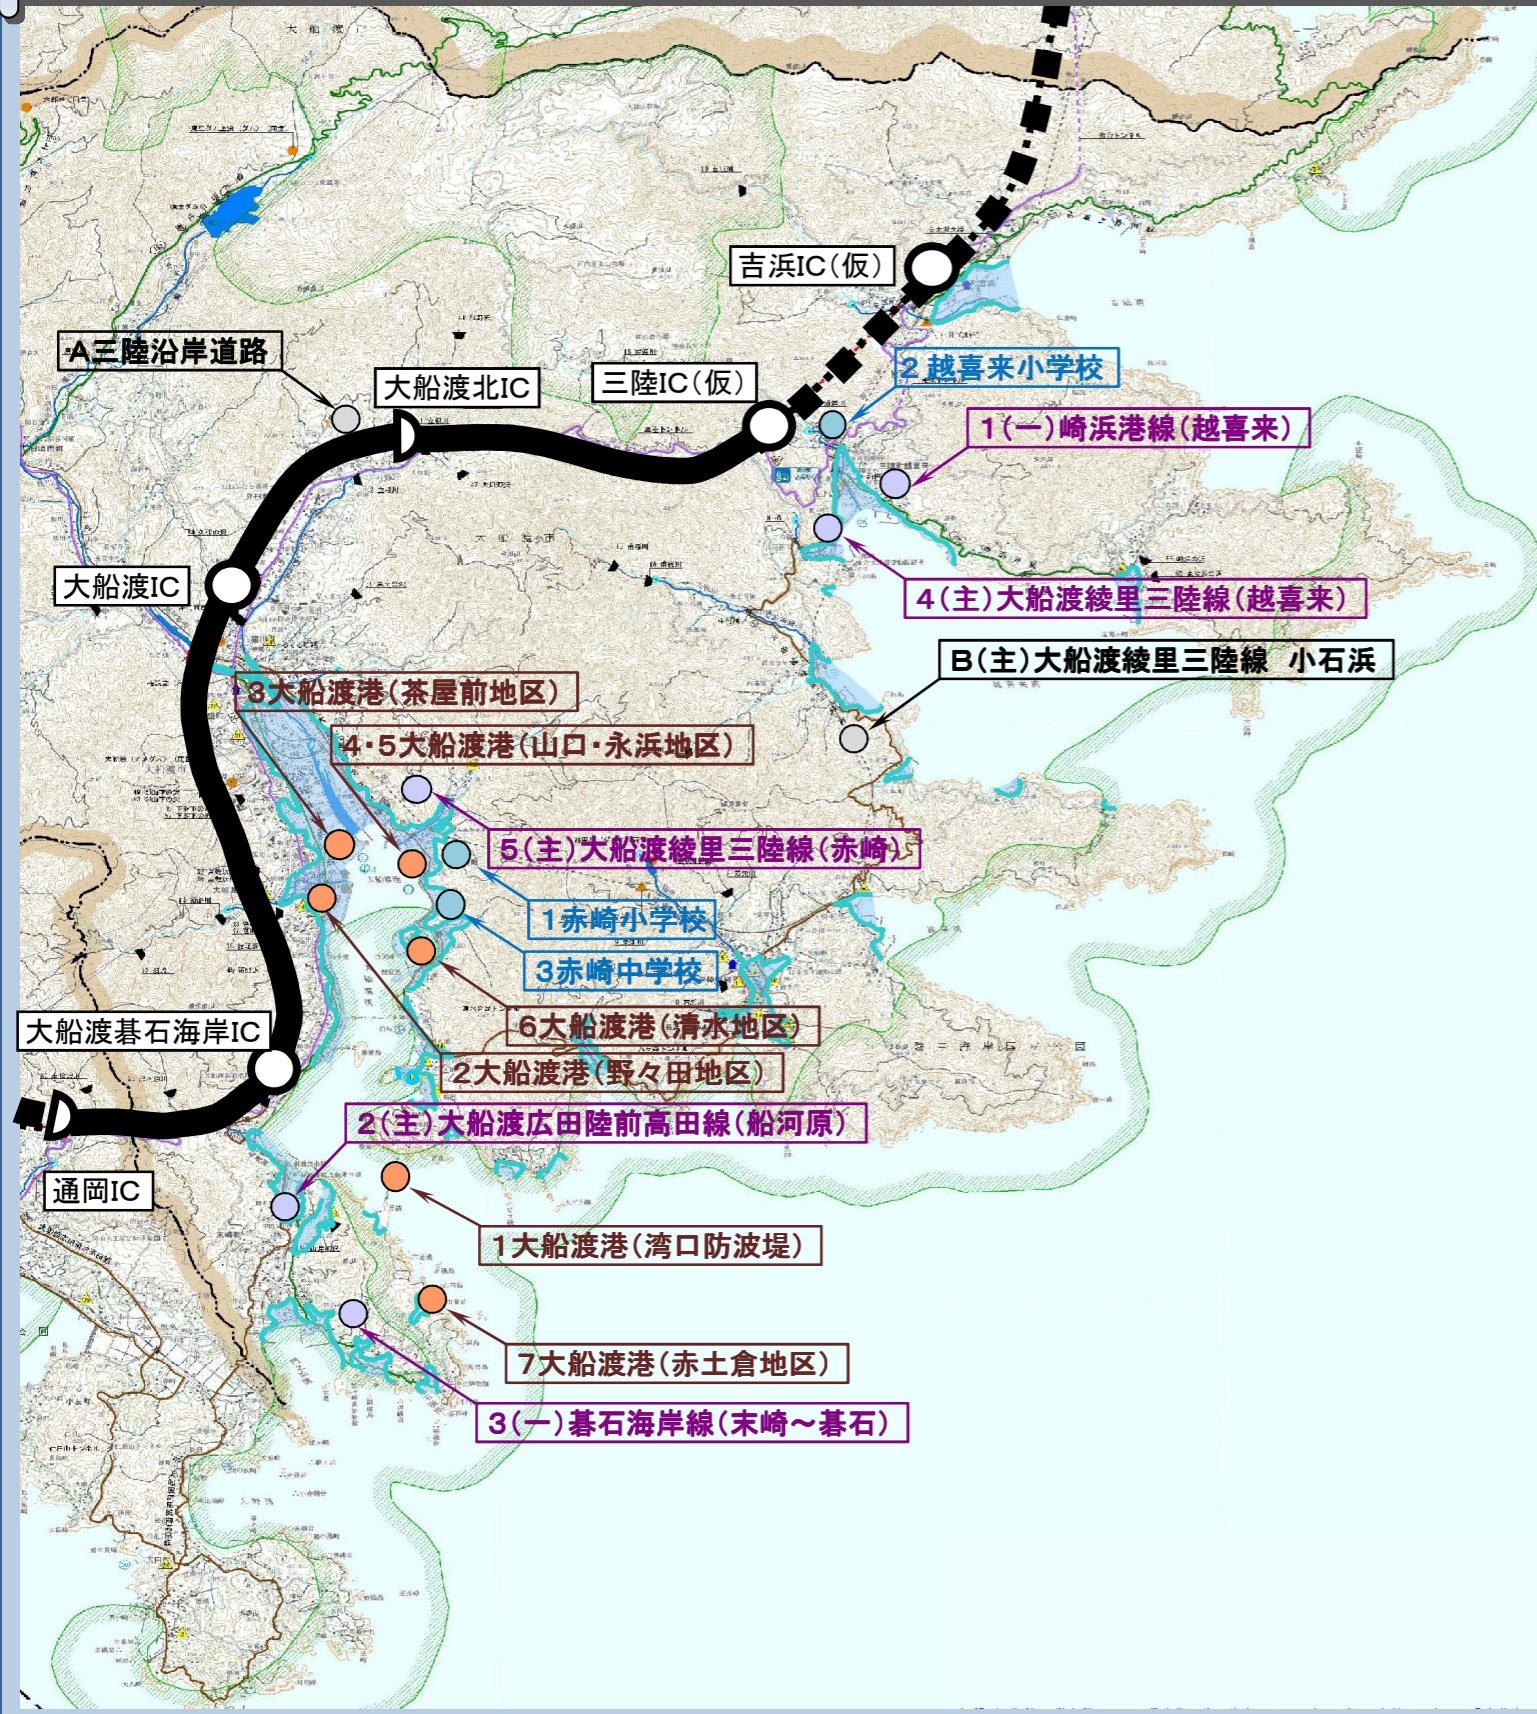


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基準復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	街路整備		路線数:1路線	整備延長:約3km	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
	まちづくり 連携道路	県	1 (一)崎浜港線	越喜来	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
			2 (主)大船渡広田陸前高田線	船河原	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
			3 (一)碁石海岸線	末崎～碁石	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
			4 (主)大船渡綾里三陸線	越喜来	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
5 (主)大船渡綾里三陸線			赤崎	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
復興道路 等	国	A	三陸沿岸道路	吉浜釜石道路 (吉浜～釜石)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.2.25起工式									
				吉浜道路	★用地・工事の推進									
	県	B	(主)大船渡綾里三陸線	小石浜	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.4着工									
港湾	大船渡港	県	1	湾口防波堤 (直轄災害復旧) 防波堤L=535m	★工事(平成27年度完成予定)									
			2	野々田地区 (災害復旧) 防波堤L=170m、 須崎防波堤L=60m、 -4.5m岸壁L=150m、 -3.0m物揚場L=87m他	★工事									
			3	茶屋前地区 (災害復旧) -9.0m岸壁L=428m、 -6.0m岸壁L=105m、 -3.0m物揚場L=376m、 -4.0m物揚場L=197m他	用地、 設計等	★工事								
			4	山口地区 (災害復旧) 防波堤L=64m、 さん橋(-2.0m)L=32m、 物揚場L=70m他		★工事								
			5	永浜地区 (災害復旧) 防波堤L=192m、 -2.0m物揚場L=108m、 -2.0m2号物揚場138m		★工事								
			6	清水地区 (災害復旧) 防波堤L=109m、 物揚場L=285m、 船揚場L=98m		★工事								
			7	赤土倉地区 (災害復旧) 南防波堤L=79m、 北防波堤L=165m、 -2.0m2号物揚場 L=104m他		★工事								
教育	小学校	市	1	赤崎小学校 (災害復旧) 移転	用地、 設計等								移転完了まで旧浦小を使用	
			2	越喜来小学校 (災害復旧) 移転	用地、 設計等								H24 浦嶺小、崎浜小と統合 移転完了まで旧浦嶺小を使用	
	中学校	3	赤崎中学校 (災害復旧) 移転	用地、 設計等								移転完了まで仮設校舎を使用		

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市4/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

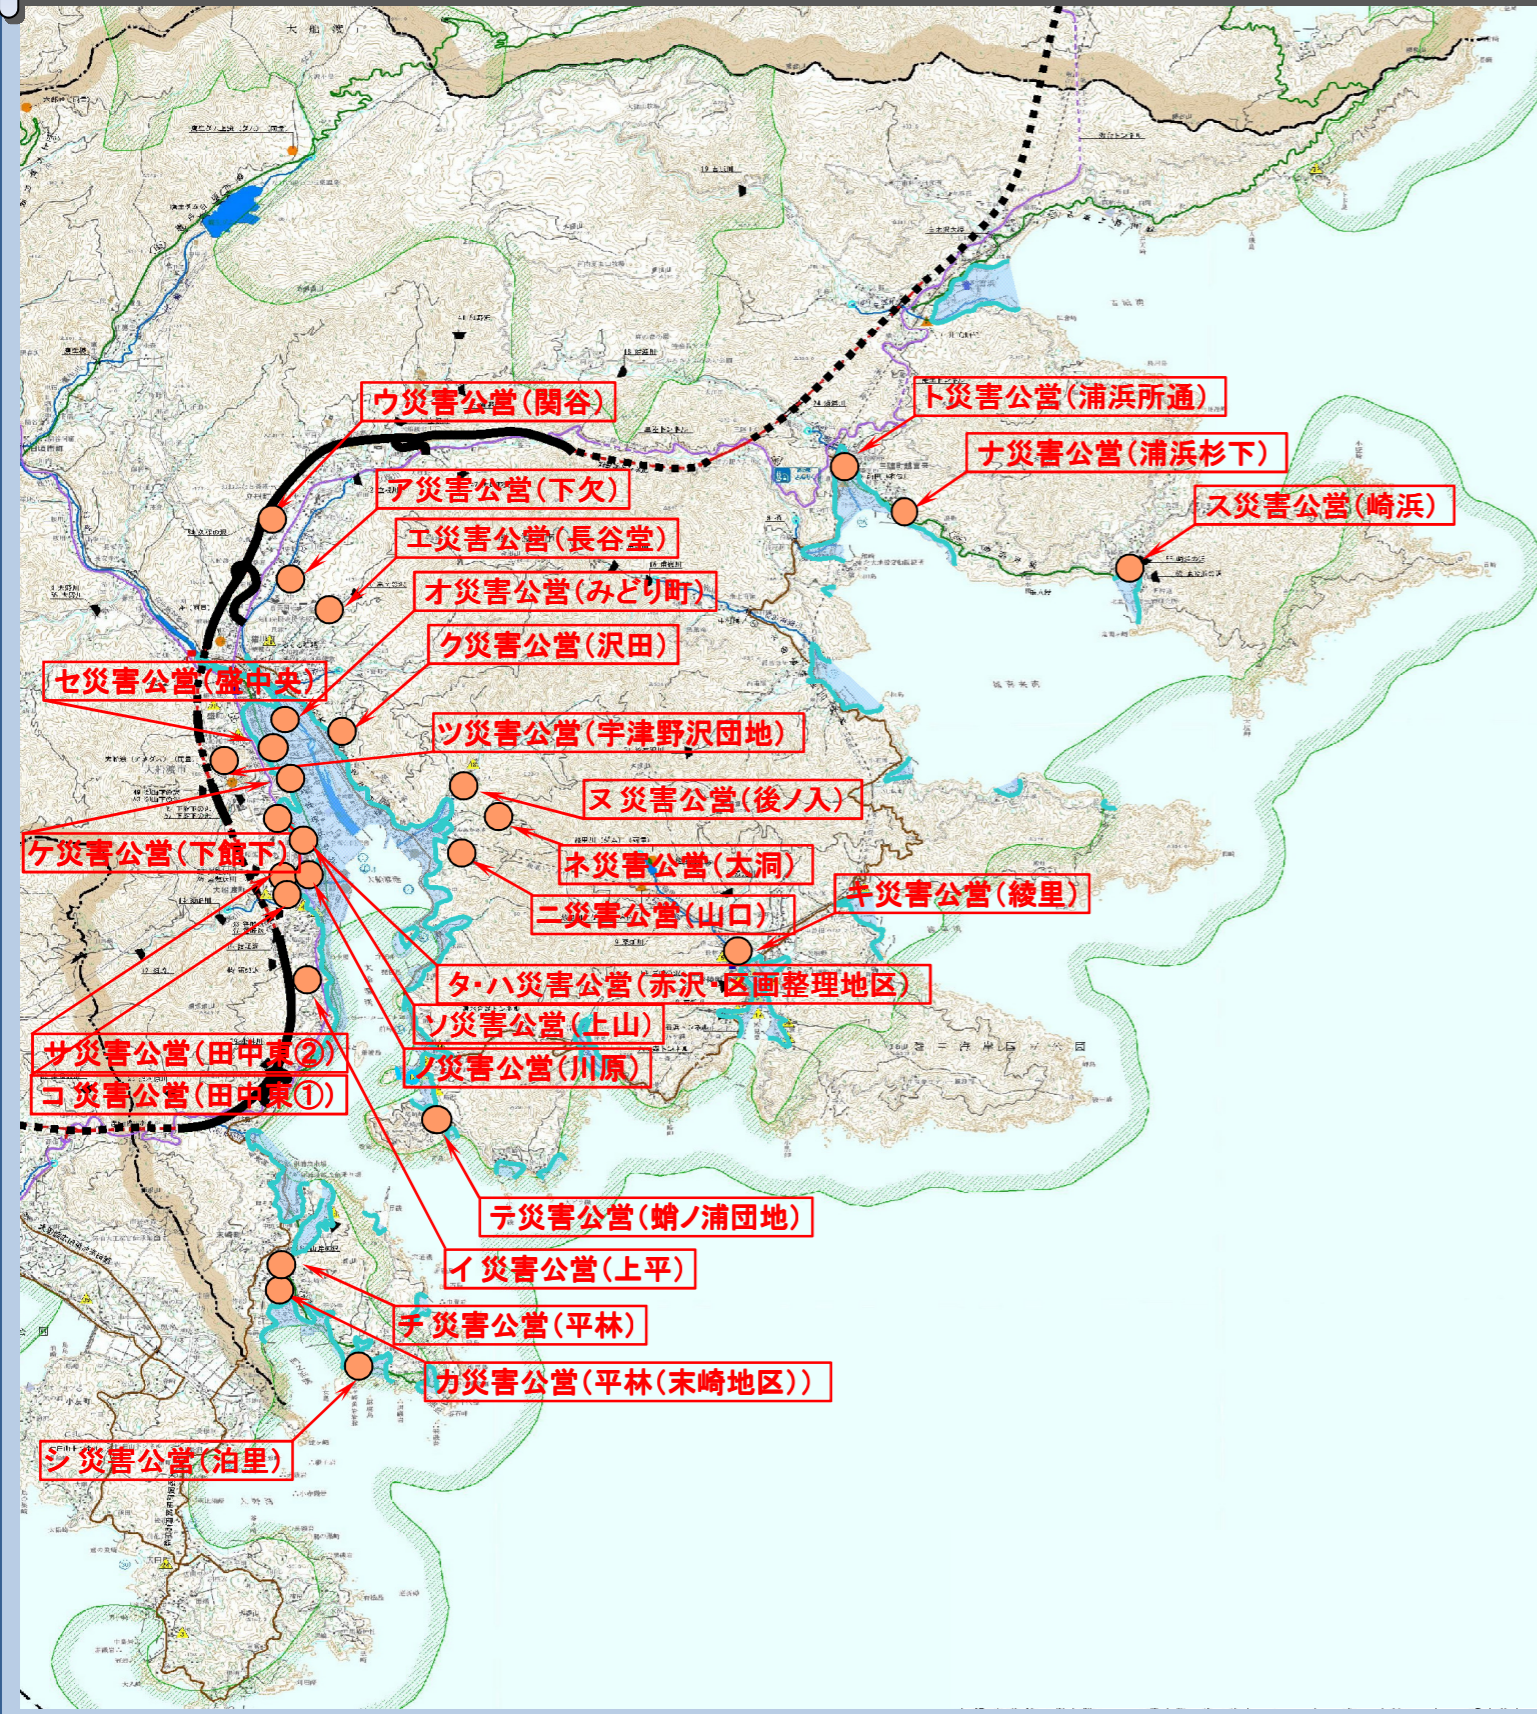


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
県	直接建設	ア	下欠(単独)	RC造3階 予定戸数: 33戸	用地、設計等			★工事					33戸
		イ	上平(単独)	RC造7階 予定戸数: 65戸	用地、設計等			★工事					65戸
		ウ	関谷(単独)	RC造5階 予定戸数: 50戸	用地、設計等			工事					50戸
		エ	長谷堂(単独)	RC造3階 予定戸数: 53戸	用地、設計等			★工事					53戸
		オ	みどり町(単独)	RC造6階 予定戸数: 147戸	用地、設計等			工事					147戸
		カ	平林(単独)	RC造4階 予定戸数: 56戸	用地、設計等			工事					56戸
		キ	綾里(単独)	RC造3階 予定戸数: 30戸	用地、設計等			★工事					30戸
		ク	沢田(単独)	RC造3階 予定戸数: 20戸	用地、設計等			工事					20戸
		ケ	下館下(単独)	RC造7階 予定戸数: 53戸	用地、設計等			工事					53戸
		市	直接建設	コ	田中東団地①(単独)	木造2階 予定戸数: 12戸		■H25.3完成					
サ	田中東団地②(単独)			木造2階 予定戸数: 7戸		■H26.3完成							7戸
シ	泊里団地(単独)			木造平屋 予定戸数: 6戸			用地、設計等		工事				6戸
ス	崎浜団地(単独)			木造平屋 予定戸数: 7戸			用地、設計等		工事				7戸
セ	盛中央(単独)			RC造5階 予定戸数: 44戸		■H24.12完成							44戸
ソ	上山団地(単独)			RC造3階 予定戸数: 11戸			★工事						11戸
タ	赤沢団地(単独)			RC造5階 予定戸数: 23戸			★工事						23戸
チ	平林団地(単独)			RC造3階 予定戸数: 11戸			★工事						11戸
ツ	宇津野沢団地(単独)			RC造3階 予定戸数: 20戸			★工事						20戸
市	買取 (雇用促進住宅)			テ	蛸ノ浦団地(単独)	RC造3階 予定戸数: 14戸			用地、設計等		工事		
		ト	浦浜所通団地(単独)	RC造3階 予定戸数: 17戸			用地、設計等		工事				17戸
		ナ	浦浜杉下団地(単独)	木造平屋 予定戸数: 6戸			用地、設計等		工事				6戸
		ニ	中赤崎山口団地(単独)	RC造3階 予定戸数: 14戸			用地、設計等		工事				14戸
		ヌ	中赤崎後ノ入団地(単独)	木造平屋 予定戸数: 6戸			用地、設計等		工事				6戸
		ネ	中赤崎大洞団地(単独)	木造平屋 予定戸数: 6戸			用地、設計等		工事				6戸
		ノ	川原(単独)	RC造3階 予定戸数: 29戸			用地、設計等		工事				29戸
		ハ	区画整理地区(大船渡地区)(単独)	RC造5階 予定戸数: 50戸			用地、設計等		工事				50戸

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市1/4】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

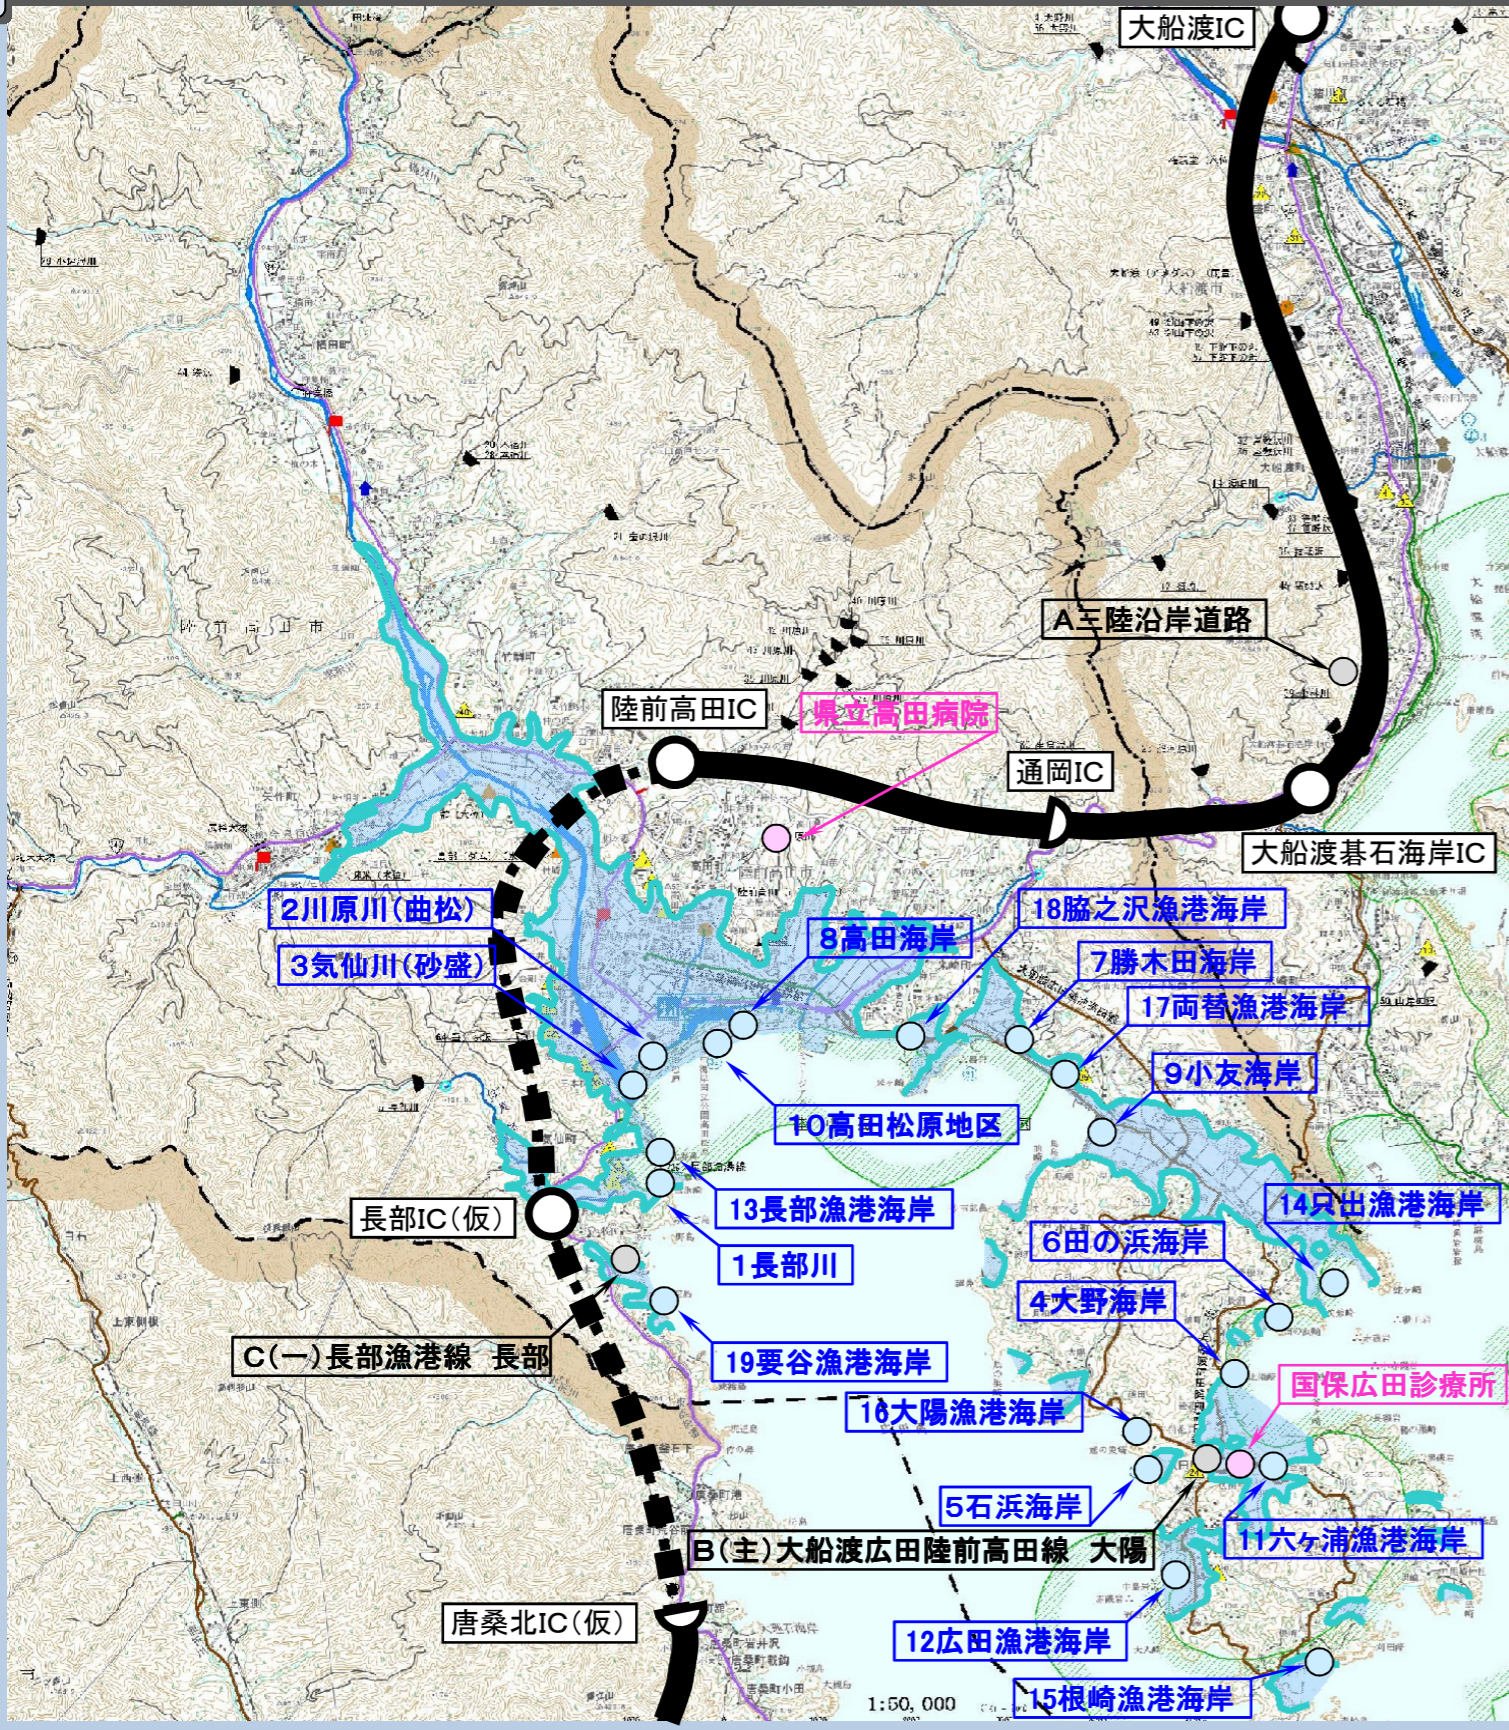


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール					
					第1期 (基礎復興期間) H23 H24 H25			第2期 (本格復興期間) H26 H27		第3期 (更なる展開への連結期間) H28 H29 H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	用地、設計等	★工事				
			2 川原川(曲松)	(災害復旧) 護岸工L=3.4km他	用地、設計等	★工事				
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基		★工事				
			4 大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、離岸堤L=0.3km他	用地、設計等	★工事				
			5 石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、離岸堤L=0.12km他	■H26.3完成					
			6 田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、消波工L=0.02km他	■H25.1完成					
			7 勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他	用地、設計等	★工事				
			8 高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	用地、設計等	★工事				
			9 小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=3基	用地、設計等	★工事				
			10 高田松原地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=1.3km	用地、設計等	工事				
	漁港海岸	市	11-1 六ヶ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	用地、設計等	★工事				
			11-2 六ヶ浦(本港地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	用地、設計等	工事				
			12-1 広田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=10基 他		★工事				
			12-2 広田(後浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	用地、設計等	工事				
			13 長部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	用地、設計等	★工事				
			14 只出漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、水門N=2基 他	用地、設計等	工事				
			15 根崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 他	用地、設計等	工事				
			16 太陽漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	用地、設計等	工事				
			17 両替漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=3基 他	用地、設計等	工事				
復興道路等	国	A 三陸沿岸道路	高田道路	■H26.3.23供用開始						
		唐桑高田道路(唐桑北～陸前高田)		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.2.6起工式						
復興関連道路	県	B(主)大船渡広田陸前高田線	大陽	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
		C(一)長部漁港線	長部	■H24.8.24供用開始						
医療	県	県立高田病院	水上山麓地区民有地	用地、設計等	工事					
			市	国保広田診療所	診療所施設整備	用地、設計等	工事			

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市3/4】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

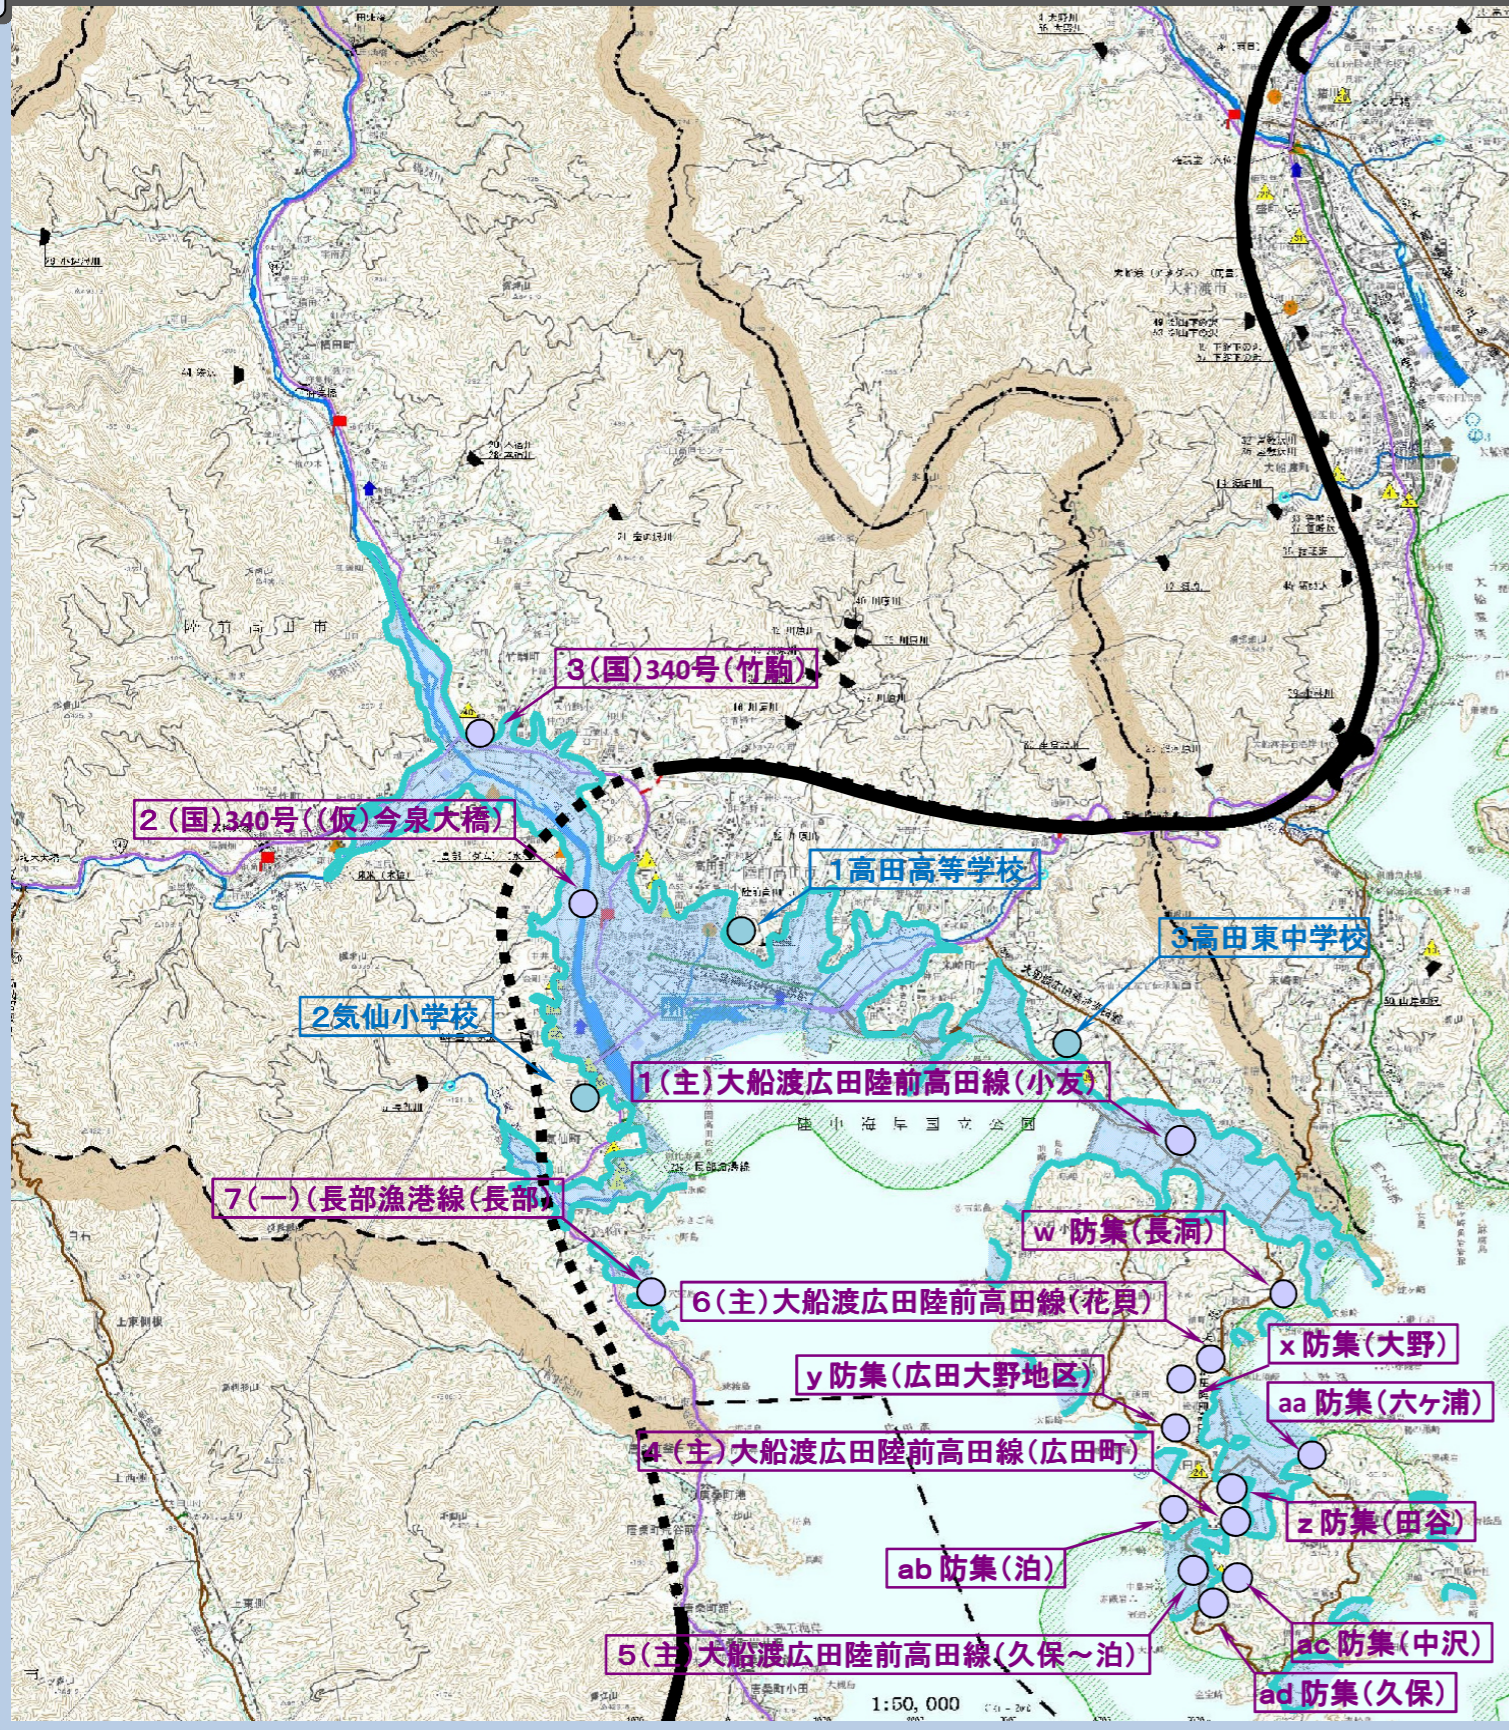


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30			
復興 まちづくり	防災集団移転	市	w 広田地区 (長洞)	対象戸数:14戸 (民14戸)	H23	H24	H25	★工事								
			x 広田地区 (大野)	対象戸数:7戸 (民7戸)	H23	H24	H25	★工事								
			y 広田地区 (広田大野)	対象戸数:65戸 (民25戸・公40戸)	H23	H24	H25	★工事								
			z 広田地区 (田谷)	対象戸数:41戸 (民41戸)	H23	H24	H25	★工事								
			aa 広田地区 (六ヶ浦)	対象戸数:7戸 (民7戸)	H23	H24	H25	★工事								
			ab 広田地区 (泊)	対象戸数:25戸 (民25戸)	H23	H24	H25	★工事								
			ac 広田地区 (中沢)	対象戸数:9戸 (民9戸)	H23	H24	H25	■H25.12完成								
			ad 広田地区 (久保)	対象戸数:6戸 (民6戸)	H23	H24	H25	★工事								
まちづくり 連携道路	県	1 (主)大船渡広田陸前高田線	小友		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		2 (国)340号	(仮)今泉大橋・大石沖		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		3 (国)340号	竹駒		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		4 (主)大船渡広田陸前高田線	広田町		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		5 (主)大船渡広田陸前高田線	久保～泊		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		6 (主)大船渡広田陸前高田線	花貝		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		7 (一)長部漁港線	長部		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
教育	高等学校	県	1 高田高等学校	(災害復旧)校舎、第一体育館、第二体育館・柔剣道場・防災対応施設												
	小学校	市	2 気仙小学校	(災害復旧)移転												H25 長部小と統合移転完了まで現在の長部小を使用
	中学校	市	3 高田東中学校	(災害復旧)移転												H25 米崎中、小友中、広田中の3校が統合移転完了まで現在の米崎中を使用

社会資本の復旧・復興ロードマップ【その他の市町村】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

沿岸12市町村以外の工程表【復興道路・復興支援道路】

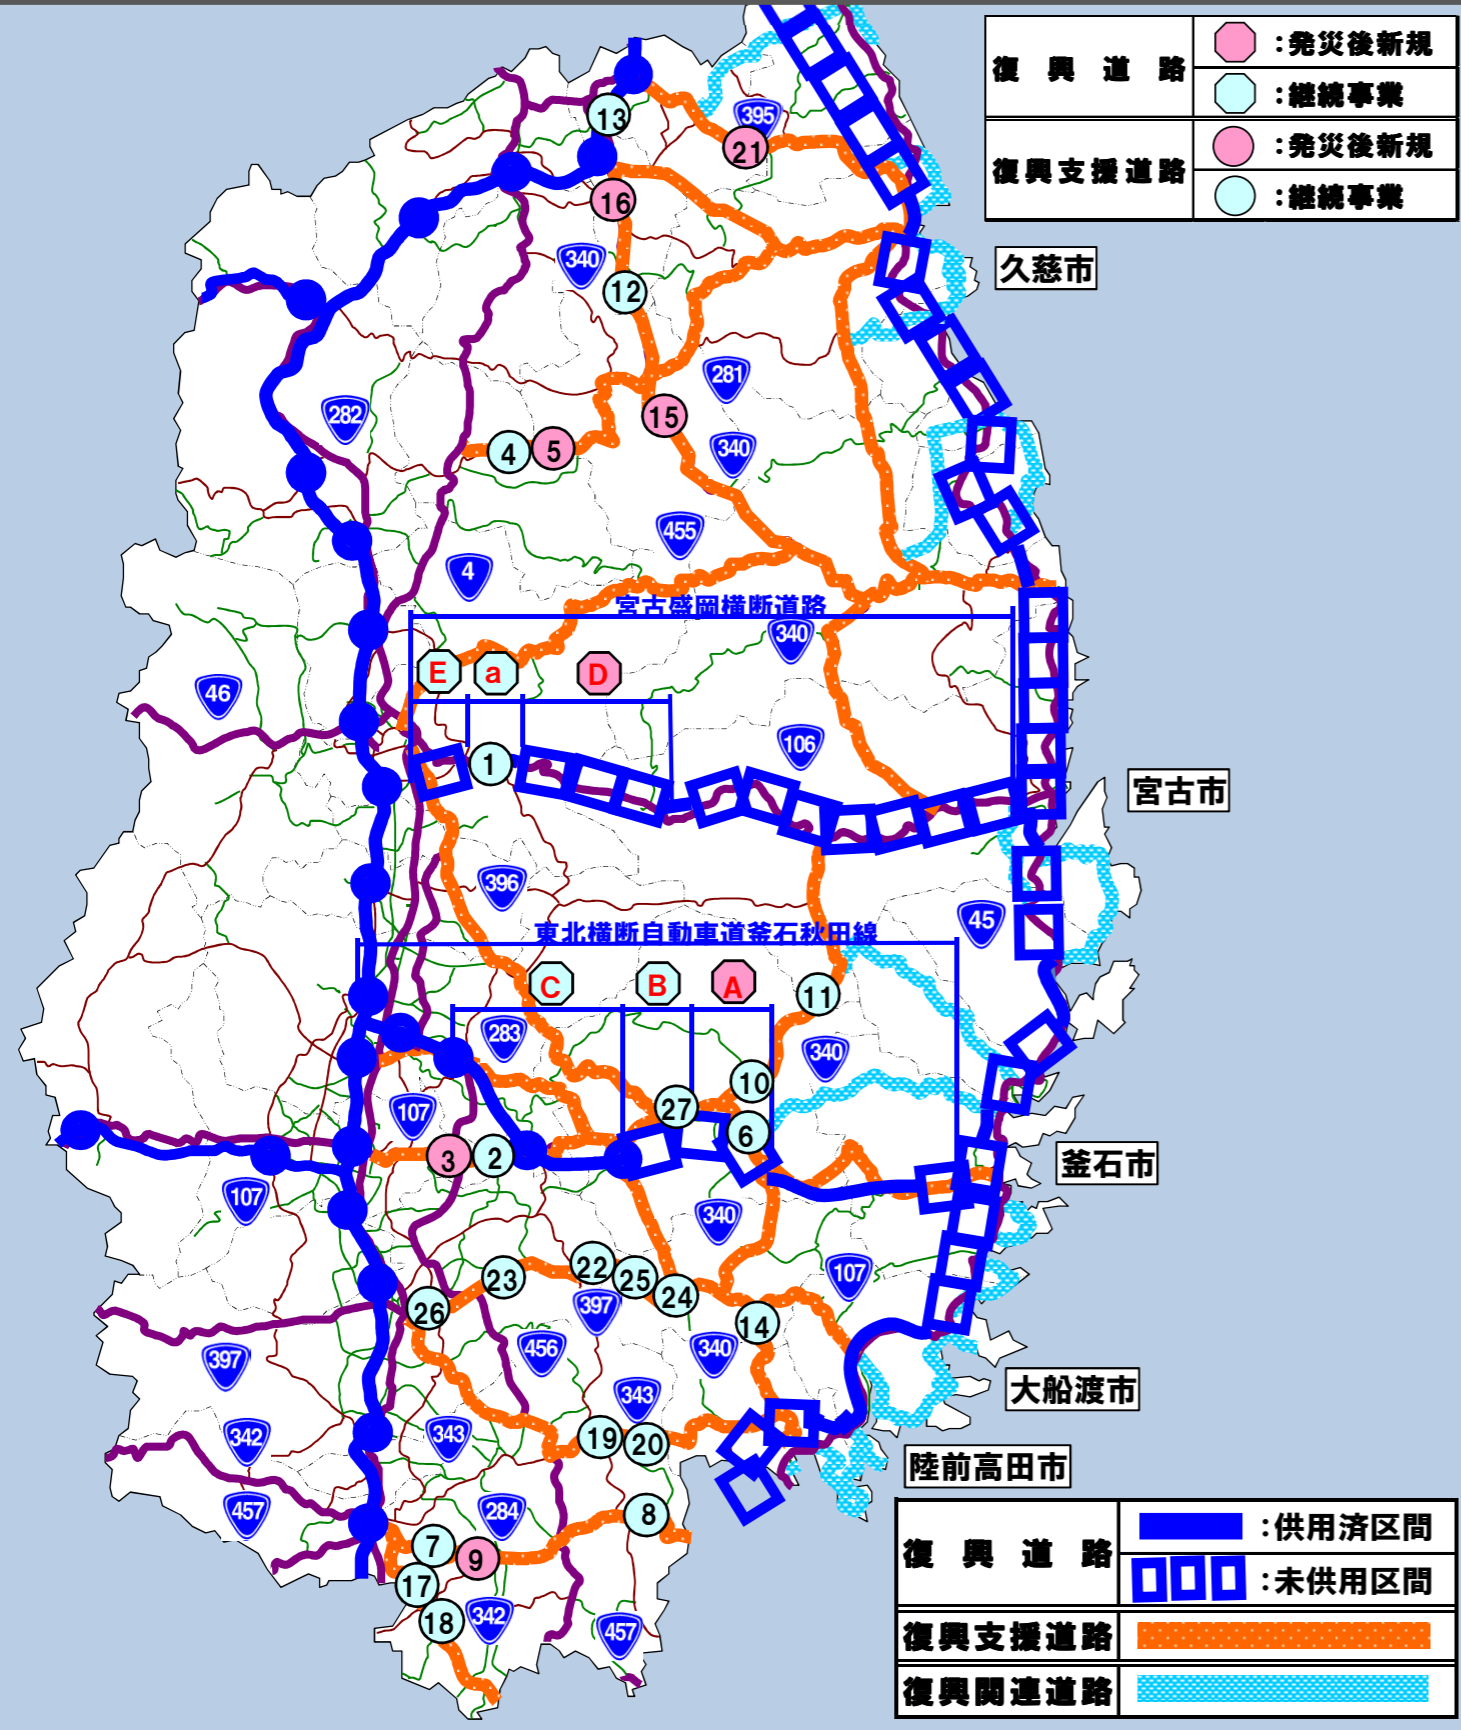

区分	種別	路線名	番号	市町村名	箇所名	年度別整備スケジュール							
						第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)		
						H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
直轄事業	復興道路	東北横断自動車道釜石秋田線	A	遠野市	遠野道路 (遠野住田～遠野)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.16起工式							
			B	遠野市	遠野～宮守	★用地・工事の推進							
			C	遠野市～花巻市	宮守～東和	■H24.11.25供用開始							
		宮古盛岡横断道路	D	宮古市～盛岡市	区界道路 (区界～築川)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			E	盛岡市	都南川目道路	★用地・工事の推進 ※川目～田の沢 H27開通予定							
県事業	復興支援道路	宮古盛岡横断道路	a	盛岡市	築川道路	■H25.3.10供用開始							
			1	盛岡市	川目	■H25.3.10供用開始							
			2	奥州市	札押道路	■H23.10.26供用開始							
				奥州市	梁川～口内	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			4	岩手町	大坊	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
				岩手町	大坊の2	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			6	遠野市	上郷道路	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			7	一関市	真滝BP	■H24.6.7供用開始							
				一関市	室根BP	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.9着工							
			9	一関市	石法華	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			10	遠野市	土淵BP	■H24.7.22一部供用開始 ■H25.12.25供用開始							
				遠野市(宮古市)	立丸峠	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.3着工							
			※宮古市の復興支援道路・国道340号立丸峠と同一箇所										
			12	九戸村	泥ノ木	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.7着工							
			13	軽米町	駒板	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
				住田町	山谷	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
				葛巻町	四日市	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.3着工							
				九戸村	長興寺	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
				17	一関市	花泉BP	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ■H23.11.29一部供用開始						
			18	一関市	白崖	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
				19	一関市	大原	■H26.3.28供用開始						
			20	一関市	一ノ通	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			21	軽米町	赤石峠	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			22	住田町	子飼沢	■H25.9.30供用開始							
				奥州市	分限城～赤金	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
				住田町	高屋敷	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
				住田町	津付道路	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
26	奥州市	小谷木橋		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
27	遠野市	新里		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
(-)遠野住田線(ICへアクセスする道路)													
