

林野火災対策砂防だより

Vol.5 令和8年10月作成

前号では、「災害関連緊急砂防事業」がどこで行われているかパート2として「堰堤の新設」を行う3箇所についてお伝えしましたが、今回お知らせするのは、「合足の沢5-(1)の新設堰堤工事の概要」についてです。


合足の沢5-(1)でどんな砂防堰堤ができる？！

○ 今回は現在工事が進められている「合足の沢5-(1)」地区でどのような工事が行われているか、どこまで進んでいるのか、いつ完成予定なのかについてお知らせします。

① 合足の沢(5)-1

工事の概要は

工 事 名：合足の沢(5)-1筋合足地区砂防堰堤築造工事
施 工 者：豊島建設株式会社
工事の期間：令和8年2月10日～令和9年2月3日
工事の費用：151百万円
作業の内容：掘削＝2,000m³（学校プール約6杯分）
コンクリート＝1,300m³（学校プール約4杯分）

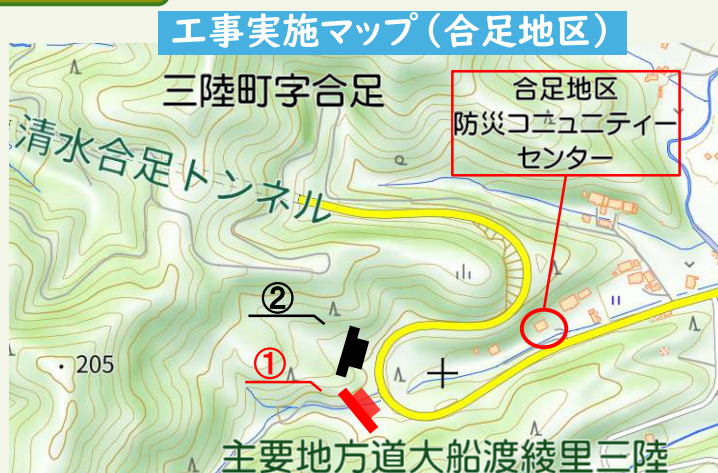


- 現在、堤体の型枠・コンクリート作業を行っております。
- 現場が綺麗に仕上がるように現場を進めております。
- 現場の作業環境はエアコンを設置しており、快適に仕事を行えるようにしております。
- 安全に工事が終わるように進めていきます。
- 地域の皆様の御理解・御協力をよろしくお願いいたします。



右側：現場責任者 小松秀樹さん
左側：現場監督 菅野匡 さん

現在の工事進捗はこんな感じです。

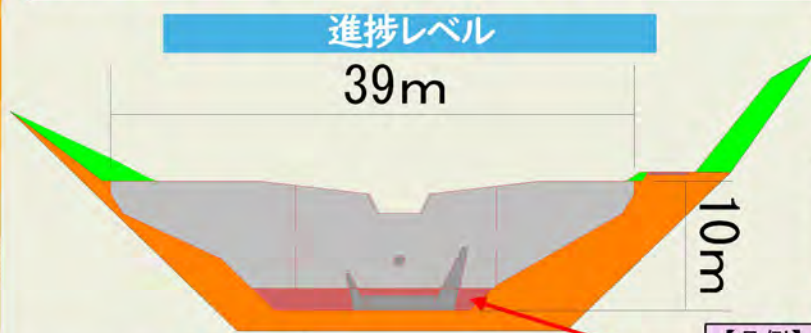

なにをしている？

進捗率: 43%

【凡例】

施工済み箇所

- これまでに、堰堤場所の土砂の撤去が完了しました。
- 現在、堰堤の高さ10mのうち約1.5mの高さまでコンクリートが仕上がりました。

進捗メータ	事前準備	伐採	支障木撤出	施工ヤード整備	本体掘削	本体築造	流路築造	後片付け	完成
合足5-(1)									

※ 合足の沢(5)-2を、別紙VOL.6で紹介しています。

～おたよりに関するお問い合わせ先～
沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター
林野火災対策砂防チーム
【電話】0192-27-9934
【E-mail】BG0005@pref.iwate.jp

携帯・スマートフォン
からはこちら



【次 回】
「災関事業どこまで進んでいる？！〈10月現在〉」
をお送りいたします。

