


いわて第2クリーンセンターの試運転が開始しました

九戸村に建設されたいわて第2クリーンセンターの施設工事が概ね完了しました。1月下旬から試運転用の廃棄物の搬入を開始し、現在実際に廃棄物を焼却・溶融して運転状況を確認しております。営業運転は4月からの予定です。

県境不法投棄現場からも、試運転用として100t程度の廃棄物（RDF様物）を搬出する予定です。

ロータリーキルン+後燃焼ストーカ炉

表面溶融炉

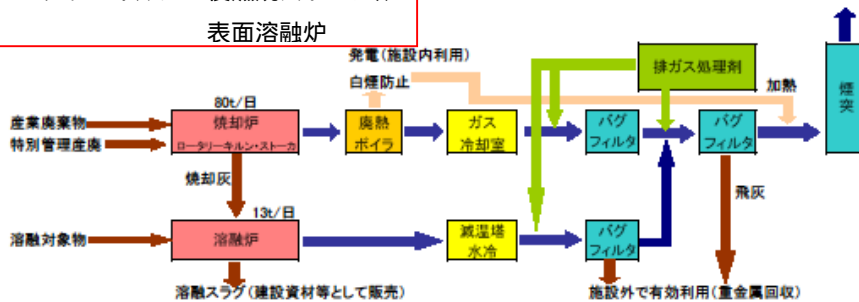

いわて第2クリーンセンター処理フロー



県境不法投棄現場からいわて第2クリーンセンターに搬出された廃棄物（RDF様物）

RDF（ごみ固形化燃料）とは、紙くずやプラスチックなどを燃料として利用できるように成形したものです。不法投棄現場には、外観をRDFに偽装しながら、金属やガラスなど不燃物が混ざられ、実際には燃料として使えない「RDF様物」が投棄されています。

第34回原状回復対策協議会を開催します。

どなたでもご自由に傍聴できますので、皆様のご来場をお待ちしております。

日時 平成21年3月21日（土） 14:15～

場所 二戸地方振興局 1階 大会議室（二戸市石切所字荷渡6-3）


廃棄物の撤去状況について（平成21年2月末現在）

表：20年度の月別撤去量（代執行）

月	撤去量 (トン)	進捗率 (%)
20年4月	136	0%
20年5月	3,755	9%
20年6月	5,407	21%
20年7月	4,160	30%
20年8月	3,742	38%
20年9月	2,450	44%
20年10月	6,818	59%
20年11月	6,256	73%
20年12月	4,984	84%
21年1月	3,112	91%
21年2月	4,260	100%
合計	45,080	

平成20年度撤去目標量 45,000トン

これまでの撤去実績(H21.2末)

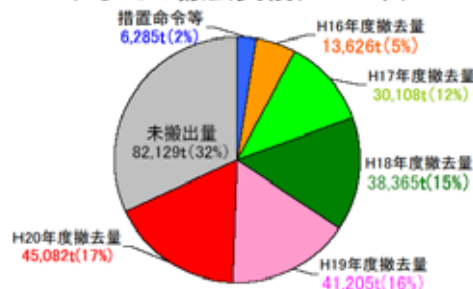

岩手県側の推定総量 256,800トンのうち、68%（累積撤去量 174,671t）を撤去しました。
